

COMITÉ EJECUTIVO No. 055 DAPRE -
MINISTERIO DE CULTURA -
ECOPETROL - ICBF
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
No. 068/16



INFRAESTRUCTURA



Findeter
Financiera del Desarrollo

\$63.854

Millones

25

Proyectos

16

Departamentos

25

Municipios

12 de febrero de 2019

JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE



CDI ENTREGADOS

25 PROYECTOS
2.609 BENEFICIARIOS
\$64.268 MILLONES DE INVERSIÓN TOTAL



CDI ENTREGADOS

25 PROYECTOS
2.609 BENEFICIARIOS
\$ 64.268 MILLONES DE INVERSIÓN TOTAL



CDI TERMINADOS

25 PROYECTOS
2.609 BENEFICIARIOS
\$ 64.268 MILLONES DE INVERSION TOTAL




CDI TERMINADOS

25 PROYECTOS
2.609 BENEFICIARIOS
\$ 64.268 MILLONES DE INVERSION TOTAL



INFRAESTRUCTURA EN ENTORNOS INSTITUCIONALES Y CULTURALES

1. Verificación del quorum
 2. Estado de los Compromisos
 3. Resumen Gestión de los Proyectos.
 4. Estado de gestión de los proyectos viabilizados.
 - 4.1. Proyectos en Ejecución – DAPRE y Otros Aportantes
 - Proyectos en Ejecución – Ecopetrol
 - Proyectos en Ejecución – ICBF
 - 4.2. Proyectos Terminados
 - 4.3. Proyectos Entregados en Liquidación
 5. Seguimiento presupuestal
 6. Propositiones y varios.
- 

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

De acuerdo al Parágrafo Primero – Quorum de la Cláusula Novena – Comité Ejecutivo del Contrato Interadministrativo 068 de 2016 y sus respectivos modificatorios, suscritos entre el DAPRE, el MINISTERIO DE CULTURA, ECOPETROL, el ICBF y la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER y FIDUCIARIABOGOTÁ S.A., la cual establece:

PARÁGRAFO PRIMERO: QUORUM: Tanto el **MINCULTURA** como **ECOPETROL** solo participarán en las sesiones del Comité Ejecutivo donde se tomen decisiones frente a la formulación y/o ejecución de proyectos en los que participan. Por su parte, **ICBF** podrá ser convocado como parte de este comité en las sesiones donde se tomen decisiones frente a los proyectos para los cuales realice aportes o podrá asistir como Entidad invitada cuando se requiera. En consecuencia, se constituirá el quorum del Comité Ejecutivo con la asistencia de la mayoría de los miembros convocados, al menos uno de los cuales debe ser un delegado del **DAPRE**. La asistencia no requiere ser presencial, pues uno o varios de los delegados podrán participar por teleconferencia, videoconferencia o cualquier otro medio semejante que permita a todos escuchar lo que se discute y manifestarse de forma inequívoca. En caso de asistencia no presencial, se dejará constancia en el acta de la reunión, anexando copia de la comunicación física o electrónica que la confirme.

PARÁGRAFO SEGUNDO: QUORUM EXCEPCIONAL: Cuando en alguna sesión o en cualquier momento de una sesión solo se vayan a tratar proyectos en cuya financiación no participen **MINCULTURA**, **ICBF** ni **ECOPETROL**, el quorum se constituirá con la asistencia del delegado de **FINDETER** y al menos un delegado del **DAPRE**.

2. ESTADO DE COMPROMISOS


No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
1	Remisión de actas de Comité Ejecutivo	FINDETER	No. 044: En firma de DAPRE No. 045: DAPRE remitió observaciones el 19/02/2016 No. 046: FINDETER remitirá acta con ajustes 13/02/2019 No. 047: En revisión de DAPRE 18/02/2019 No. 049: En revisión de DAPRE 18/02/2019 No. 050: En revisión de DAPRE 18/02/2019 No. 051: En revisión de DAPRE 19/02/2019 No. 052: En firma de ICBF No. 053: En revisión de DAPRE 13/02/2019 No. 054: DAPRE remitió con observaciones el 19/02/2016	EN PROCESO
2	<ul style="list-style-type: none"> DAPRE y FINDETER deben contactar al alcalde de Valencia para presionar por sus respectivos compromisos: transformador y acometida eléctrica. Definir si se adelanta contratación de los servicios públicos de Tierralta. Remisión comunicaciones a los municipios (Tierralta y Valencia) con plazo perentorio para la conexión de los servicios públicos. 	FINDETER y DAPRE	Mediante comunicados No. 22019300027210 y 22019300027211 del 05/02/2019 Findeter informó a los municipios de Valencia y Tierralta sobre el plazo perentorio para adelantar las actividades pendientes (término de 30 días calendario), previo al inicio de las acciones judiciales.	EN PROCESO
3	ICBF continuará gestionando los temas con la alcaldía de Vélez sobre la fábrica de bocadillos y la caldera.	ICBF	El Comité Ejecutivo 054 ICBF informó que se adelantaron audiencias de conciliación con propietarios de predios aledaños y que algunos ya hicieron los cierres correspondientes y otros están pendientes.	EN PROCESO
4	ECOPETROL debe enviar comunicación donde informe sobre el uso de los recursos que estaban destinados al proyecto en Mocoa. Unificar las propuestas enviadas a ECOPETROL y que la nueva propuesta incluya al proyecto de Mocoa	DAPRE / ECOPETROL	Continua pendiente confirmación por parte de Ecopetrol y DAPRE la suscripción del nuevo Contrato Interadministrativo. En Comité Ejecutivo 054, DAPRE informó que adelantaría reunión con Ecopetrol.	EN PROCESO

2. ESTADO DE COMPROMISOS

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	ESTADO ACTUAL	
5	Para los proyectos SIPI y LITORAL, FINDETER debe confirmar al DAPRE y a MINCULTURA que el acta de liquidación se finalice durante el mes de septiembre de 2018.	FINDETER	En reporte del 19 de febrero de 2019 se remitió estado de liquidaciones.	EN PROCESO
6	Informar sobre el concepto de Electricaribe sobre el proyecto eléctrico en San Pedro.	FINDETER	Se remitió subsanación a Electricaribe el 14/02/2019.	EN PROCESO
7	Contratación cubierta (posventas aguas lluvias) CDI La Montañita	FINDETER	Se expidió CDR por valor de \$41.369.597, se solicitaron ajustes a la matriz de riesgos según últimas instrucciones jurídicas.	EN PROCESO
8	Adelantar mesa de trabajo entre Findeter e ICBF para revisión de lineamientos de Teorama.	FINDETER	Se adelantó reunión el 29 de enero de 2019.	EN PROCESO

3. RESUMEN GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

ESTADO GENERAL 25 PROYECTOS

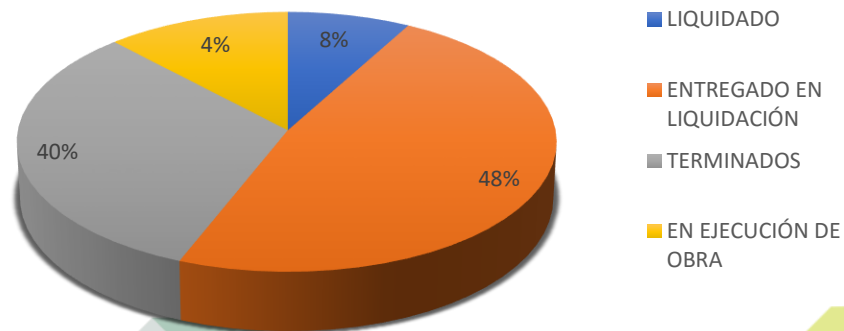


ESTADO/ MUNICIPIO	N° PROYECTOS
LIQUIDADOS	1
BRICEÑO - PUEBLO NUEVO (ANTIOQUIA)	1
ENTREGADOS EN LIQUIDACIÓN	13
MOCOA ETAPA 1 (PUTUMAYO)	1
LETICIA (AMAZONAS)	1
SIPÍ (CHOCÓ)	1
LITORAL DEL SAN JUAN (CHOCÓ)	1
POTOSÍ (NARIÑO)	1
MACEDONIA (AMAZONAS)	1
ZONA BANANERA (MAGDALENA)	1
TESALIA (HUILA)	1
APARTADÓ (ANTIOQUIA)	1
LA MONTAÑITA (CAQUETÁ)- (Recibido por la Alcaldía)	1
BAHÍA PORTETE (GUAJIRA)	1
SAN LORENZO (NARIÑO)	1
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ)	1
TERMINADOS	10
VALENCIA (CÓRDOBA)	1
YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)	1
TIERRALTA (CÓRDOBA)	1
SAN PEDRO (SUCRE)	1
POLICARPA (NARIÑO)	1
ANAPOIMA (CUNDINAMARCA)	1
EL DONCELLO (CAQUETÁ)	1
EL PAUJIL (CAQUETÁ)	1
CLEMENCIA (BOLIVAR)	1
TEORAMA (NORTE DE SANTANDER)	1
EN EJECUCIÓN DE OBRA	1
VÉLEZ (SANTANDER)	1
EN ETAPA DE PRECONTRACTUAL	
Obras complementarias de La Montaña	1/05/2019
TOTAL GENERAL	25

4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.1 Proyectos en Ejecución - DAPRE y otros aportantes

PROYECTO	CAPACIDAD (NIÑOS)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN	FECHA TERM ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI Clemencia (Bolívar)	160	Valor Inicial: 3.439.296.855 Etapa 1 \$12.449.040 Etapa 2 \$3.426.847.815 + \$662.506.440 (muro de contención, estabilización y demolición, escorrentías, muros de cerramiento colegio, obras provisionales aguas escorrentías, base de tanque, tanque séptico, baranda de seguridad pozo eyector, traslado acometida y cajas eléctrica) + \$227.473.373,00 (impermeabilización, piso en caucho para juegos infantiles, señalización y placa en contrapiso). Valor Final: \$4.329.276.668	21-Dic-17	6 meses + 3 meses de prórrogas + 45 días de prórroga	26-Ene-19	Ejecu: 96% Prog: 100,00%	<p>El 19 de febrero de 2019 Electricaribe aprobó el diseño. En 5 días hábiles adelantaran visita final de obra para verificar que lo construido corresponda a lo diseñado, una vez verificado se realiza conexión eléctrica y luego se obtienen las certificaciones RETE.</p> <p><u>Procesos de incumplimiento ET2: Pendiente presentar en comité técnico el cierre del incumplimiento sin aplicación de apremio.</u></p>

Avance corte 20 de enero de 2019.

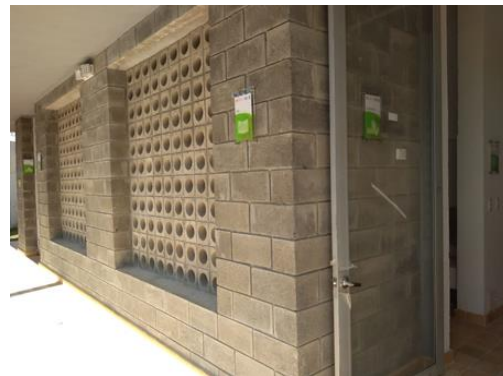

4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.1 Proyectos en Ejecución - Ecopetrol

PROYECTO	CAPACIDAD (NIÑOS)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN ETAPA 2	FECHA TERM ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI Teorama (Norte de Santander)	65	Valor Inicial: \$1.375.043.676,00 Etapa 1: \$35.125.730 Etapa 2: \$1.339.917.946 +\$33.297.470 (andenes) Valor Final: \$1.408.341.146,00	8-mar-18	4 meses + 37 días de suspensión + 60 días prórroga + 20 días suspensión + 30 días de prórroga+ 20 días suspensión+ 15 días de prórroga	30-Ene-2019	Ejec: 89% Prog: 100%	Se continúa en la ejecución de las actividades eléctricas, instalación de carpintería metálica, entre otros. <u>Proceso de incumplimiento ET 2: N/A.</u>

Avance corte 17 de febrero de 2019




4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.1 Proyectos en Ejecución - ICBF

PROYECTO	CAPACIDAD (niños)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN	FECHA TERM ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI Vélez (Santander)	160	Valor Inicial: \$3.606.250.622,00 Etapa 1 \$36.955.700 Etapa 2 \$3.569.294.922 + \$205.263.121,00 (muros de contención, puntos de agua caliente, calentador a gas, lavamanos de pedal, piso en vidrio de seguridad, sistema fotovoltaico y parque) + \$9.675.295,00 (señalización) Valor Final: \$3.821.189.038,00	2-Abr-18	5 meses y 15 días + 5,5 meses de prórroga	28-Feb-2019	Ejecu: 89% Prog: 94%	Continúan con la instalación del cieloraso, pintura, carpintería metálica. Se continua con la instalación de las marquesinas. <u>Proceso de incumplimiento ET 1: cerrado.</u> <u>Proceso de incumplimiento ET 2: se aprobó en Comité Fiduciario No. 073 del 24 de septiembre de 2018 la aplicación de la Cláusula Penal de Apremio por valor de \$68.518.762,00.</u>

Avance corte 17 de febrero de 2019

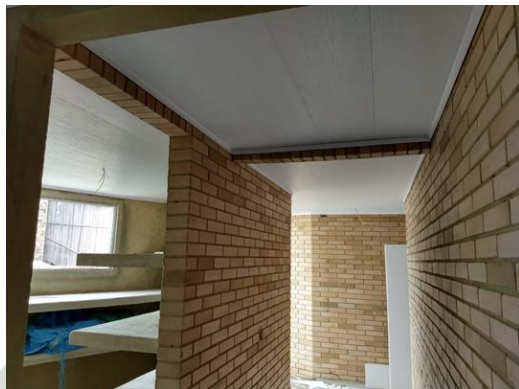

4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.2. Proyectos Terminados - Ecopetrol

PROYECTO	CAPACIDAD (niños)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN ETAPA 2	FECHA TERM ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI El Paujil (Caquetá)	95	Valor Inicial: \$ 2.417.457.428,00 Etapa 1 \$35.660.772 Etapa 2 \$2.381.796.656 + \$47.397.201,72 (andenes, sardinel y señalización) Valor Final: \$ 2.464.854.629,72	5-abr-18	5 meses + 45 días de prórroga + 30 días de prórroga	19-Nov-18	Ejecu: 100% Progr: 100%	Se programa recibo de obra para el 28 de febrero de 2019. <u>Proceso de incumplimiento ET 1: pendiente de cierre.</u> <u>Proceso de incumplimiento ET 2: N/A.</u>

Avance corte 17 de febrero de 2019.



4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.2. Proyectos Terminados - Ecopetrol

PROYECTO	CAPACIDAD (NIÑOS)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN ETAPA 2	FECHA TERM ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI El Doncello (Caquetá)	160	Valor Inicial: \$ 2.568.688.279 Etapa 1 \$36.949.500 Etapa 2 \$2.531.738.779 + \$80.356.634 (actividades de ejecución condicionada, andenes, parques, señalización y lavamanos de pedal) + \$18.046.765 (para la instalación de aleros) Valor Final: \$2.667.091.678	8-mar-18	5 meses y 15 días + 45 días prórroga + 21 días prórroga + 25 días prórroga	22-Nov-18	Ejecu: 99,00% Prog: 100,00%	<p>Se programa recibo de obra para el 27 de febrero de 2019.</p> <p><u>Proceso de incumplimiento ET1: cerrado.</u></p> <p><u>Proceso de incumplimiento ET 2: se presentó a Comité Fiduciario No. 078 del 29/10/2018 la aplicación de la Cláusula Penal de Apremio por valor de \$12.658,694. Findeter solicitó tasación al informe del interventor.</u></p>

Avance corte 17 de febrero de 2019.



4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.2. Proyectos Terminados – Dapre y otros aportantes

PROYECTO	CAPACIDAD (NIÑOS)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN	FECHA TERM ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI Anapoima (Cundinamarca)	95	Valor Inicial: \$2.105.557.993 Etapa 1 \$34.510.000 Etapa 2 \$2.071.047.993 + \$460.671.702 (sistema fotovoltaico, carpintería metálica, pañete, pintura, mampostería, piso en baldosín, mortero de nivelación, guardaescobas, placa de cubierta, acero de refuerzo, puerta entamborada, columnas, bordillo, mesones e impermeabilización) + \$149.665.897,57 (acceso al CDI, muros de cerramiento y placas en concreto) + \$22.602.221,54 (señalización y parque) Valor Final: \$2.738.497.814,11	22-Mar-18	5 meses + 2 meses de prórroga + 15 días prórroga	6-Nov-18	Ejecu: 99,00% Prog: 100,00%	<p>El contratista informa que en la presente semana entrega la certificación RETIE.</p> <p>Se encuentra pendiente la extensión de red de gas por parte de la Alcaldía. Findeter reiteró requerimiento a la Alcaldía el 19 de febrero de 2019.</p> <p><u>Proceso de incumplimiento ET 1: cerrado.</u></p>

Avance corte de 17 de febrero de 2019.



4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.2. Proyectos Terminados – Dapre y otros aportantes

PROYECTO	CAPACIDAD (NIÑOS)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN ETAPA 2	FECHA TERM ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI San Pedro (Sucre)	95	Valor Inicial: \$2.386.999.603 Etapa 1 \$35.919.550 Etapa 2 \$2.351.080.053 + \$215.755.533 (esp. Carpintería metálica, pozo eyector, andén perimetral, apantallamiento y red de media tensión). + \$57.619.030,00 (señalización, sistema BMS y persianas). Valor Final: \$2.660.374.166	22-Feb-18	5 meses + 60 días de prórroga + 20 días de prórroga	10-Oct-18	Ejecu: 98,50% Prog: 100,00%	<p>El jueves 14/02/2019 se remitió la ultima respuesta a Electricaribe, a las observaciones. Findeter se encuentra atento al pronunciamiento.</p> <p>El 18/02/2019 Findeter dio respuesta a Surtigas con copia a la Superintendencia de Servicios Públicos sobre la instalación de la red de gas.</p> <p><u>Proceso de incumplimiento ET1: pendiente cierre.</u></p> <p><u>Proceso de incumplimiento ET2: Se procederá el cierre de los incumplimientos teniendo en cuenta que el contratista subsanó las observaciones.</u></p>

Avance corte 17 de febrero de 2019.



4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.2. Proyectos Terminados

PROYECTO	CAPACIDAD (NIÑOS)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN	FECHA TERM ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI Policarpa (Nariño)	40	Valor Inicial: \$1.264.683.799 Etapa 1 \$35.695.510 Etapa 2 \$1.228.988.289 + \$65.167.769 (andenes, red de media tensión, red contra incendio, red de alcantarillado, ajuste de diseños, lavamanos de pedal y plataforma metálica para cuarto de basuras) + \$13.878.272 (ingreso aguas lluvias en área administrativa, angeo, señalización). Valor Final: \$1.343.729.840	20-Mar-18	5 meses + 45 días de prórroga + 15 días de prórroga	19-Oct-18	Ejecu: 100% Prog: 100%	<p>Mediante correo electrónico del 15 de febrero de 2019, se remitió al DAPRE la certificación RETILAP, se continua el tramite de la conexión eléctrica definitiva.</p> <p>Se propone entrega del proyecto para la primera semana de marzo de 2019.</p> <p><u>Procesos de incumplimiento ET 2: FINDETER solicitó a la interventoría pronunciamiento de los descargos presentados por el contratista de obra.</u></p>

Avance corte 17 de febrero de 2019.



4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.2. Proyectos Terminados

PROYECTO	CAPACIDAD (NIÑOS)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN	FECHA TERM ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI Tierralta (Córdoba)	160	Valor Inicial: \$2.714.621.403 Etapa 1 \$28.798.000 Etapa 2 \$2.626.867.359 Altern. Sost. \$58.956.044 + \$100.444.841 (ajuste carpintería metálica, señalización, sistema BMS, apantallamiento y compuertas de tanque enterrado) Valor Total: \$2.815.066.244	25-Oct-17	6 meses + 60 días de prórroga + 60 días de prórroga + 30 días de prórroga	22-sept-18	Ejecu: 99,55% Prog: 100,00%	<p>Se remitió a la alcaldía de Tierralta, la comunicación No. 22019300027211 del 5 de febrero de 2019 con plazo perentorio (30 días) para ejecución de las actividades relacionadas con servicios públicos.</p> <p>Actualmente se adelanta la red contraincendios por parte del contratista.</p> <p>Proceso de incumplimiento ET1: cerrado Proceso de incumplimiento ET2: apremio por \$38.588.682 Proceso de incumplimiento 2 ET2: pendiente de cierre.</p>

Avance corte 17 de febrero de 2018



4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.2 Proyectos Terminados

PROYECTO	CAPACIDAD (NIÑOS)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN ETAPA 2	FECHA TERM ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI Yotoco (Valle del Cauca)	95	Valor Inicial: \$ 2.161.660.476 Etapa 1 \$36.955.450 Etapa 2 \$2.124.705.026 + \$43.550.976.00 (parques, señalización y lavamanos de pedal) Valor Final: \$ 2.205.211.452	23-Nov-17	5 meses + 2 meses prórroga + 2 meses prórroga	22-Ago-18	98%	<p>Pendiente las certificaciones RETIE y RETILAP por parte del contratista. En conversación telefónica del 15 de febrero de 2019, la empresa de energía manifestó que procederán con la conexión eléctrica. A través del profesional de Findeter en la oficina de Cali, se va a realizar verificación en el proyecto teniendo en cuenta que la alcaldía no ha informado sobre la conexión eléctrica.</p> <p><u>Proceso de incumplimiento ET 2: el contratista objetó el acta de cierre del proceso de incumplimiento, el cual se encuentra en revisión de FINDETER.</u></p>

Avance corte 17 de febrero de 2019.



4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.3 Proyectos Entregados en Liquidación

PROYECTO	CAPACIDAD (NIÑOS)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN ETAPA 2	FECHA TERM. ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI Potosí (Nariño)	95	Valor Inicial: \$2.571.268.745 Etapa 1: \$34.800.000 Etapa 2: \$2.494.588.570 inicial + \$41.880.175 (Alternativas de sostenibilidad) + \$68.675.353 (Dry Wall, señalización y parque) Valor Final: \$2.639.944.098	20-Jun-17	6 meses + 20 días de prórroga + 1 mes de prórroga	30-Ene-18	100%	<p>Postventas: Contratista presentó informe con registro fotográfico de las subsanaciones adelantadas. Interventor remitió aprobación de las actividades adelantadas el 15/02/2019.</p> <p>Mediante comunicación No. 220193300027390 del 11 de febrero de 2019, teniendo en cuenta que el CDI se encuentra en operación, Findeter recomienda a DAPRE e ICBF gestionar ante la alcaldía la ejecución de las actividades que le corresponden.</p>

Avance corte 17 de febrero de 2019.



4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.3 Proyectos Entregados en Liquidación

PROYECTO	CAPACIDAD (NIÑOS)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN ETAPA 2	FECHA TERM ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI Apartadó (Antioquia)	300	Valor inicial: \$3.213.721.467 Etapa 1: \$36.000.000 Etapa 2: \$3.177.721.467 + \$334.733.720 (Alternativa Sostenibilidad, red de gas, cielo raso, andenes, parque, señalización y ventiladores) + \$46.490.133 (vía de acceso) Valor Final: \$3.594.945.320	01-Jun-17	8 meses + 30 días de prorrogas	1-Mar-18	100%	<p>POSVENTAS:</p> <p>El 18/02/2019 se adelantó visita Findeter, ICBF, Alcaldía Municipal y contratista con el fin de verificar el informe de posventas del 07/11/2018 del ICBF aportado por DAPRE el 11/02/2019. Al respecto el contratista de manera inmediata inició subsanaciones que le corresponden y con respecto a otras, Findeter adelanta la revisión de las mismas toda vez que podrían estar causadas por deficiencias en el mantenimiento.</p> <p>Durante la visita se evidenció que están utilizando el CDI para almacenamiento de materiales de una obra aledaña.</p> <p>Findeter remitirá el informe de subsanación y los requerimientos correspondientes a las partes.</p>

Avance corte 20 de febrero de 2019.



6. SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL - APORTES

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER S.A.

CONTROL DE SALDOS POR FUENTE DE RECURSOS

ENERO 31 DE 2019

APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068					
FUENTE	ENTIDAD	RECURSOS VIGENCIA 2016	RECURSOS VIGENCIA 2017	RECURSOS VIGENCIA 2018	VALOR TOTAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068	DAPRE	14.311.500.000,00	30.299.200.000,00	6.137.032.741,00	50.747.732.741,00
	MINCULTURA	1.866.000.000	-	-	1.866.000.000,00
	ECOPETROL	-	3.600.000.000,00	2.400.000.000,00	6.000.000.000,00
	ICBF	-	150.000.000,00	850.000.000,00	1.000.000.000,00
SUBTOTAL APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068					59.613.732.741,00
OTROS APORTES	JAPÓN	-	898.169.415,00	939.298.140,00	1.837.467.555,00
	CEMEX	-	402.325.200,00	150.000.000,00	552.325.200,00
	FONDO ABU DHABI	-	-	1.826.671.680,00	1.826.671.680,00
	EXCEDENTE BRICEÑO	-	-	10.963.333,00	10.963.333,00
	APREMIOS	-	-	-	-
SUBTOTAL OTROS APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068					4.227.427.768,00
TOTAL APORTES (Contrato Interadministrativo 068 y otros aportes)					63.841.160.509,00
Valor sin GMF					

RECURSOS COMPROMETIDOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068	
VALOR CONTRATACIÓN + ADICIONES	54.304.667.230,00
VALOR ASISTENCIA TÉCNICA	5.430.466.723,00
DEVOLUCIÓN ECOPETROL	1.288.344.788,65
DEVOLUCIÓN ECOPETROL ABU DHABI	390.815.050,00
GMF RECURSOS ECOPETROL, ICBF Y CEMEX	29.684.008,00
ESTIMADO ADICIONES PENDIENTES	2.360.000.000,00
CONTRATACIÓN MONTAÑA	41.369.597,00
(instalación cubierta y manejo de aguas lluvias)	
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	63.803.977.799,65

TOTAL RECURSOS SIN COMPROMETIDOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068	
APORTES - RECURSOS COMPROMETIDOS	37.182.709,35

6. SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL – RECURSOS RECIBIDOS

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER S.A.

CONTROL DE SALDOS POR FUENTE DE RECURSOS

DICIEMBRE 31 DE 2018

APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068				
FUENTE	ENTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR RECIBIDO	SALGO POR GIRAR
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068	DAPRE	50.747.732.741,00	47.535.700.000,00	3.212.032.741,00
	MINCULTURA	1.866.000.000,00	1.866.000.000,00	0
	ECOPETROL	6.000.000.000,00	3.600.000.000,00	2.400.000.000,00
	ICBF	1.000.000.000,00	450.000.000,00	550.000.000,00
VALOR RECURSOS RECIBIDOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		59.613.732.741,00	53.451.700.000,00	6.162.032.741,00

OTROS APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068				
FUENTE	ENTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR RECIBIDO	SALGO POR GIRAR
OTROS APORTES	JAPÓN	1.837.467.555,00	1.837.467.555,00	0,00
	CEMEX	552.325.200,00	552.325.200,00	0,00
	FONDO ABU DHABI	1.826.671.680,00	1.826.671.680,00	0,00
VALOR RECURSOS RECIBIDOS OTROS APORTANTES		4.216.464.435,00	4.216.464.435,00	0,00

VALOR TOTAL RECURSOS RECIBIDOS CI Y OTROS APORTES	63.830.197.176,00	57.668.164.435,00	6.162.032.741,00
---	-------------------	-------------------	------------------

6. SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL – RECURSOS CAUSADOS

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER S.A.

CONTROL DE SALDOS POR FUENTE DE RECURSOS

DICIEMBRE 31 DE 2018

TOTAL APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068				
FUENTE	ENTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR CAUSADO POR LA FIDUCIARIA A TERCEROS	VALOR PENDIENTE POR GIRAR A TERCEROS
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068	DAPRE	50.747.732.741,00	39.449.502.387,00	11.298.230.354,00
	MINCULTURA	1.866.000.000,00	1.623.915.400,00	242.084.600,00
	ECOPETROL	6.000.000.000,00	1.016.820.730,00	4.983.179.270,00
	ICBF	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00
OTROS APORTES	JAPÓN	1.837.467.555,00	1.837.467.555,00	-
	CEMEX	552.325.200,00	-	552.325.200,00
	FONDO ABU DHABI	1.826.671.680,00	1.826.671.680,00	-
TOTAL		63.830.197.176,00	45.754.377.752,00	18.075.819.424,00



Findeter

Financiera del Desarrollo

JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINHACIENDA



MINCULTURA



BIENESTAR
FAMILIAR



ecopETROL
