

COMITÉ EJECUTIVO No. 054 DAPRE -
MINISTERIO DE CULTURA -
ECOPETROL - ICBF
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
No. 068/16



INFRAESTRUCTURA



Findeter
Financiera del Desarrollo

\$63.854

Millones

25

Proyectos

16

Departamentos

25

Municipios

25 de enero de 2019

JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE



CDI ENTREGADOS

25 PROYECTOS
2.609 BENEFICIARIOS
\$64.268 MILLONES DE INVERSIÓN TOTAL



CDI ENTREGADOS

25 PROYECTOS

2.609 BENEFICIARIOS

\$ 64.268 MILLONES DE INVERSION TOTAL



CDI TERMINADOS

25 PROYECTOS
2.609 BENEFICIARIOS
\$ 64.268 MILLONES DE INVERSION TOTAL




CDI TERMINADOS

25 PROYECTOS
2.609 BENEFICIARIOS
\$ 64.268 MILLONES DE INVERSION TOTAL



INFRAESTRUCTURA EN ENTORNOS INSTITUCIONALES Y CULTURALES

1. Verificación del quorum
 2. Estado de los Compromisos
 3. Resumen Gestión de los Proyectos.
 4. Estado de gestión de los proyectos viabilizados.
 - 4.1. Proyectos en Ejecución – DAPRE y Otros Aportantes
 - Proyectos en Ejecución – Ecopetrol
 - Proyectos en Ejecución – ICBF
 - 4.2. Proyectos Terminados
 - 4.3. Proyectos Entregados en Liquidación
 5. Seguimiento presupuestal
 6. Propositiones y varios.
- 

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

De acuerdo al Parágrafo Primero – Quorum de la Cláusula Novena – Comité Ejecutivo del Contrato Interadministrativo 068 de 2016 y sus respectivos modificatorios, suscritos entre el DAPRE, el MINISTERIO DE CULTURA, ECOPETROL, el ICBF y la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER y FIDUCIARIABOGOTÁ S.A., la cual establece:

PARÁGRAFO PRIMERO: QUORUM: Tanto el **MINCULTURA** como **ECOPETROL** solo participarán en las sesiones del Comité Ejecutivo donde se tomen decisiones frente a la formulación y/o ejecución de proyectos en los que participan. Por su parte, **ICBF** podrá ser convocado como parte de este comité en las sesiones donde se tomen decisiones frente a los proyectos para los cuales realice aportes o podrá asistir como Entidad invitada cuando se requiera. En consecuencia, se constituirá el quorum del Comité Ejecutivo con la asistencia de la mayoría de los miembros convocados, al menos uno de los cuales debe ser un delegado del **DAPRE**. La asistencia no requiere ser presencial, pues uno o varios de los delegados podrán participar por teleconferencia, videoconferencia o cualquier otro medio semejante que permita a todos escuchar lo que se discute y manifestarse de forma inequívoca. En caso de asistencia no presencial, se dejará constancia en el acta de la reunión, anexando copia de la comunicación física o electrónica que la confirme.

PARÁGRAFO SEGUNDO: QUORUM EXCEPCIONAL: Cuando en alguna sesión o en cualquier momento de una sesión solo se vayan a tratar proyectos en cuya financiación no participen **MINCULTURA**, **ICBF** ni **ECOPETROL**, el quorum se constituirá con la asistencia del delegado de **FINDETER** y al menos un delegado del **DAPRE**.

2. ESTADO DE COMPROMISOS


No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
1	Remisión de actas de Comité Ejecutivo	FINDETER	No. 044: FINDETER remitirá acta ajustada el 28/01/2019 No. 045: FINDETER remitirá acta ajustada el 28/01/2019 No. 046: FINDETER remitirá acta ajustada el 29/01/2019 No. 047: FINDETER remitirá acta ajustada el 29/01/2019 No. 049: FINDETER remitirá acta ajustada el 30/01/2019 No. 050: FINDETER remitirá acta ajustada el 30/01/2019 No. 051: FINDETER remitirá acta ajustada el 30/01/2019 No. 052: 25/01/2018 DAPRE remitió observaciones al acta No. 053: 25/01/2018 DAPRE remitió observaciones al acta	EN PROCESO
2	DAPRE y FINDETER deben contactar al alcalde de Valencia para presionar por sus respectivos compromisos: transformador y acometida eléctrica.	FINDETER y DAPRE	Procuraduría Regional informó que en el presente mes remitió un nuevo requerimiento a la alcaldía de Valencia. Findeter adelantó seguimiento el 21 de enero de 2019 ante Electricaribe e informaron que persisten las observaciones del municipio. Asesor Jurídico Externo de Findeter remitió concepto jurídico sobre situación municipios que incumplen, se adelantará la medida correspondiente.	EN PROCESO
3	ICBF continuará gestionando los temas con la alcaldía de Vélez sobre la fábrica de bocadillos y la caldera.	ICBF	El Comité Ejecutivo 053 ICBF informó que se adelantaron audiencias de conciliación con propietarios de predios aledaños.	EN PROCESO
4	ECOPETROL debe enviar comunicación donde informa sobre el uso de los recursos que estaban destinados al proyecto en Mocoa. Unificar las propuestas enviadas a ECOPETROL y que la nueva propuesta incluya al proyecto de Mocoa	DAPRE / ECOPETROL	Continua pendiente confirmación por parte de Ecopetrol y DAPRE la suscripción del nuevo Contrato Interadministrativo.	EN PROCESO
5	El DAPRE solicita a FINDETER, reiterar comunicación a la Alcaldía de Teorama relacionada con el cerramiento vecino que invade la zona verde del proyecto.	FINDETER	Contratista dio inicio a la construcción del cerramiento, tras conversaciones con la comunidad.	CERRADO

2. ESTADO DE COMPROMISOS

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	ESTADO ACTUAL	
6	Para los proyectos SIPI y LITORAL, FINDETER debe confirmar al DAPRE y a MINCULTURA que el acta de liquidación se finalice durante el mes de septiembre de 2018.	FINDETER	En reporte del 25 de enero de 2019 se remitió estado de liquidaciones.	EN PROCESO
7	Informar sobre el concepto de Electricaribe sobre el proyecto eléctrico en San Pedro.	FINDETER	El 21 de enero de 2019 consultor VIC remitió ultima	EN PROCESO
8	El DAPRE remitirá a FINDETER el calendario estimado de las inauguraciones de los próximos CDI.	DAPRE	DAPRE informa que la Consejera está revisando la disponibilidad de la agenda para definir las fechas de las inauguraciones.	EN PROCESO
9	Contratación cubierta (posventas aguas lluvias) CDI La Montañita	FINDETER	Se adelanta elaboración de estudio previo con cotizaciones recibidas, se estima publicación contratación en el mes de febrero de 2019.	EN PROCESO
10	Revisión de iluminación y observaciones muros de las aulas del CDI El Paujil.	FINDETER	Findeter remitió comunicado 220163300028051 en respuesta a las observaciones técnicas.	CERRADO
11	Definir si se adelanta contratación de los servicios públicos de Tierralta.	FINDETER/DAPRE	Findeter recibió concepto jurídico de asesor externo y se procederá a demandar a los municipios.	EN PROCESO

3. RESUMEN GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

ESTADO GENERAL 25 PROYECTOS

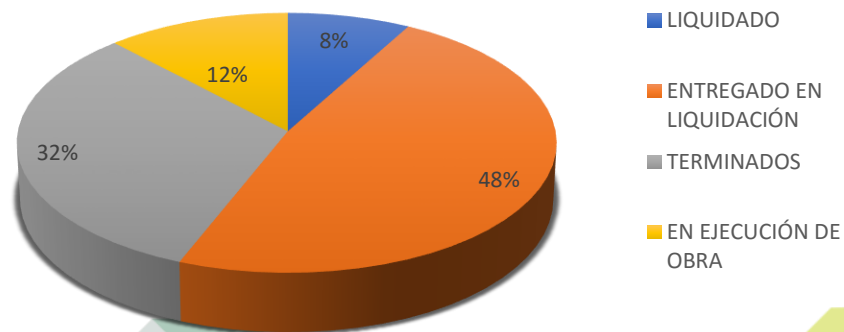

ESTADO/ MUNICIPIO	N° PROYECTOS	
LIQUIDADOS	1	
BRICEÑO - PUEBLO NUEVO (ANTIOQUIA)	1	
ENTREGADOS EN LIQUIDACIÓN	13	
MOCO A ETAPA 1 (PUTUMAYO)	1	
LETICIA (AMAZONAS)	1	
SIPÍ (CHOCÓ)	1	
LITORAL DEL SAN JUAN (CHOCÓ)	1	
POTOSÍ (NARIÑO)	1	
MACEDONIA (AMAZONAS)	1	
ZONA BANANERA (MAGDALENA)	1	
TESALIA (HUILA)	1	
APARTADÓ (ANTIOQUIA)	1	
LA MONTAÑITA (CAQUETÁ)	1	
BAHÍA PORTETE (GUAJIRA)	1	
SAN LORENZO (NARIÑO)	1	
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ)	1	
TERMINADOS	8	FECHAS ENTREGAS ESTIMADAS
VALENCIA (CÓRDOBA)	1	14/06/2019
YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)	1	11/03/2019
TIERRALTA (CÓRDOBA)	1	14/06/2019
SAN PEDRO (SUCRE)	1	15/03/2019
POLICARPA (NARIÑO)	1	11/03/2019
ANAPOIMA (CUNDINAMARCA)	1	15/03/2019
EL DONCELLO (CAQUETÁ)	1	28/02/2019
EL PAUJIL (CAQUETÁ)	1	28/02/2019
EN EJECUCIÓN DE OBRA	3	
CLEMENCIA (BOLIVAR)	1	24/06/2019
TEORAMA (NORTE DE SANTANDER)	1	24/06/2019
VÉLEZ (SANTANDER)	1	24/06/2019
TOTAL GENERAL	25	

4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.1 Proyectos en Ejecución - DAPRE y otros aportantes

PROYECTO	CAPACIDAD (NIÑOS)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN	FECHA TERM ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI Clemencia (Bolívar)	160	Valor Inicial: 3.439.296.855 Etapa 1 \$12.449.040 Etapa 2 \$3.426.847.815 + \$662.506.440 (muro de contención, estabilización y demolición, escorrentías, muros de cerramiento colegio, obras provisionales aguas escorrentías, base de tanque, tanque séptico, baranda de seguridad pozo eyector, traslado acometida y cajas eléctrica) + \$227.473.373,00 (impermeabilización, piso en caucho para juegos infantiles, señalización y placa en contrapiso). Valor Final: \$4.329.276.668	21-Dic-17	6 meses + 3 meses de prórrogas + 45 días de prórroga	26-Ene-19	Ejecu: 96% Prog: 99,00%	<p>Interventoría informó que las actividades para la red de media tensión están finalizadas, pendiente aprobación Electricaribe para conexión final.</p> <p>Se adelantó suspensión hasta el 21 de enero de 2019 por tramite ante Electricaribe.</p> <p>Certificación RETIE interno ya adelantaron visita y se encuentran en revisión documental.</p> <p>Certificación RETIE media tensión depende de aprobación de Electricaribe.</p> <p><u>Procesos de incumplimiento ET2: Interventor presentó pronunciamiento sobre descargos de la interventoría.</u></p>

Avance corte 20 de enero de 2019.



4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.1 Proyectos en Ejecución - Ecopetrol

PROYECTO	CAPACIDAD (NIÑOS)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN ETAPA 2	FECHA TERM ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI Teorama (Norte de Santander)	65	Valor Inicial: \$1.375.043.676,00 Etapa 1: \$35.125.730 Etapa 2: \$1.339.917.946 +\$33.297.470 (andenes) Valor Final: \$1.408.341.146,00	8-mar-18	4 meses + 37 días de suspensión + 60 días prórroga + 20 días suspensión + 30 días de prórroga+ 20 días suspensión+ 15 días de prórroga	30-Ene-2019	Ejec: 80% Prog: 94%	<p>Se adelantó suspensión por solicitud del contratista según información de JAC motivada en el desplazamiento del personal por festividades de fin de año y se prorrogó por término de 15 días. La interventoría asumió su mayor permanencia. Se inició instalación de la carpintería metálica y se avanza en las instalaciones eléctricas.</p> <p>Según lo informado por el contratista y confirmado por la interventoría, se están presentando enfrentamientos en el corregimiento. El personal de obra continua ejecutando actividades sin embargo generaron la alerta.</p> <p><u>Proceso de incumplimiento ET 2: Findeter envió requerimiento a la compañía de seguros y solicitud de reunión, no han confirmado fecha.</u></p>

Avance corte 18 de enero de 2019




4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.1 Proyectos en Ejecución - ICBF

PROYECTO	CAPACIDAD (niños)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN	FECHA TERM ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI Vélez (Santander)	160	Valor Inicial: \$3.606.250.622,00 Etapa 1 \$36.955.700 Etapa 2 \$3.569.294.922 + \$205.263.121,00 (muros de contención, puntos de agua caliente, calentador a gas, lavamanos de pedal, piso en vidrio de seguridad, sistema fotovoltaico y parque) + \$9.675.295.00 (señalización) Valor Final: \$3.821.189.038,00	2-Abr-18	5 meses y 15 días + 5,5 meses de prórroga	28-Feb-2019	Ejecu: 81% Prog: 86%	<p>Se presentó en comité fiduciario prórroga hasta el 28 de feb. de 2019, contratista asumió mayor permanencia de la interventoría.</p> <p>Se adelantan actividades de instalación de pisos y enchapes, resanes, se fundió placa tanque de almacenamiento de red contraincendios y agua potable. En la presente semana, se da inicio a la instalación de la carpintería metálica.</p> <p><u>Proceso de incumplimiento ET 1: pendiente de cierre.</u></p> <p><u>Proceso de incumplimiento ET 2: se aprobó en Comité Fiduciario No. 073 del 24 de septiembre de 2018 la aplicación de la Cláusula Penal de Apremio por valor de \$68.518.762.00.</u></p>

Avance corte 20 de enero de 2019.

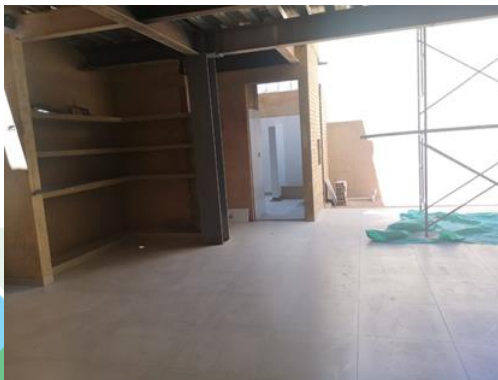

4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.2. Proyectos Terminados - Ecopetrol

PROYECTO	CAPACIDAD (niños)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN ETAPA 2	FECHA TERM ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI El Paujil (Caquetá)	95	Valor Inicial: \$ 2.417.457.428,00 Etapa 1 \$35.660.772 Etapa 2 \$2.381.796.656 + \$47.397.201,72 (andenes, sardinel y señalización) Valor Final: \$ 2.464.854.629,72	5-abr-18	5 meses + 45 días de prórroga + 30 días de prórroga	19-Nov-18	Ejecu: 98,50% Progr: 100,00%	<p>Findeter remitió comunicado 220163300028051 del 28 de diciembre de 2018 en respuesta a las observaciones de lineamientos.</p> <p>El contratista radicó ultima versión de la documentación para entrega de proyecto el 24/01/2019 al interventor.</p> <p><u>Proceso de incumplimiento ET 1: pendiente de cierre.</u></p> <p><u>Proceso de incumplimiento ET 2: N/A.</u></p>

Avance corte 9 de diciembre de 2018.



4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.2. Proyectos Terminados - Ecopetrol

PROYECTO	CAPACIDAD (NIÑOS)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN ETAPA 2	FECHA TERM ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI El Doncello (Caquetá)	160	Valor Inicial: \$ 2.568.688.279 Etapa 1 \$36.949.500 Etapa 2 \$2.531.738.779 + \$80.356.634 (actividades de ejecución condicionada, andenes, parques, señalización y lavamanos de pedal) + \$18.046.765 (para la instalación de aleros) Valor Final: \$2.667.091.678	8-mar-18	5 meses y 15 días + 45 días prórroga + 21 días prórroga + 25 días prórroga	22-Nov-18	Ejecu: 99,00% Prog: 100,00%	<p>Próxima semana se adelantará visita empresa certificadora RETIE y RETILAP.</p> <p>El 22/01/2019, se adelantó visita final de la interventoría para verificación de observaciones y detalles que se encontraban pendientes por subsanar. El 28/01/2019 se realizará seguimiento de revisión documental para la entrega.</p> <p><u>Proceso de incumplimiento ET1: cerrado.</u></p> <p><u>Proceso de incumplimiento ET 2: se presentó a Comité Fiduciario No. 078 del 29/10/2018 la aplicación de la Cláusula Penal de Apremio por valor de \$12.658,694. Se dio apertura a un segundo proceso de incumplimiento, el interventor se pronunció sobre descargos del contratista.</u></p>

Avance corte 24 de enero de 2019



4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.2. Proyectos Terminados – Dapre y otros aportantes

PROYECTO	CAPACIDAD (NIÑOS)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN	FECHA TERM ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI Anapoima (Cundinamarca)	95	Valor Inicial: \$2.105.557.993 Etapa 1 \$34.510.000 Etapa 2 \$2.071.047.993 + \$460.671.702 (sistema fotovoltaico, carpintería metálica, pañete, pintura, mampostería, piso en baldosin, mortero de nivelación, guardaescobas, placa de cubierta, acero de refuerzo, puerta entamborada, columnas, bordillo, mesones e impermeabilización) + \$149.665.897,57 (acceso al CDI, muros de cerramiento y placas en concreto) + \$22.602.221,54 (señalización y parque) Valor Final: \$2.738.497.814,11	22-Mar-18	5 meses + 2 meses de prórroga + 15 días prórroga	6-Nov-18	Ejecu: 99,00% Prog: 100,00%	<p>La Empresa Certificadora RETIE y RETILAP adelantó segunda visita el 22/01/2019.</p> <p>Respecto al servicio de gas, alcaldía remitió comunicación informando que dieron respuesta al requerimiento de la Empresa de Gas del 15 de enero 2019.</p> <p><u>Proceso de incumplimiento ET 1: cerrado.</u></p>

Avance corte de 20 de enero de 2019.



4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.2. Proyectos Terminados – Dapre y otros aportantes

PROYECTO	CAPACIDAD (NIÑOS)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN ETAPA 2	FECHA TERM ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI San Pedro (Sucre)	95	Valor Inicial: \$2.386.999.603 Etapa 1 \$35.919.550 Etapa 2 \$2.351.080.053 + \$215.755.533 (esp. Carpintería metálica, pozo eyector, andén perimetral, apantallamiento y red de media tensión). + \$57.619.030,00 (señalización, sistema BMS y persianas). Valor Final: \$2.660.374.166	22-Feb-18	5 meses + 60 días de prórroga + 20 días de prórroga	10-Oct-18	Ejecu: 98,50% Prog: 100,00%	<p>El 21 de enero de 2019, VIC remitió la subsanación a las ultimas observaciones de Electricaribe, Findeter se encuentra gestionando la revisión de las mismas.</p> <p>En conversación telefónica del 21 de enero de 2019, Surtigas informó que se encuentra aprobada la instalación del servicio de gas para el CDI.</p> <p><u>Proceso de incumplimiento ET1: pendiente cierre.</u></p> <p><u>Proceso de incumplimiento ET2: la interventoría presentó pronunciamiento ante la Fiduciaria por los descargos del contratista, ajusto la tasación.</u></p>

Avance corte 21 de enero de 2019.



4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.2. Proyectos Terminados

PROYECTO	CAPACIDAD (NIÑOS)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN	FECHA TERM ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI Policarpa (Nariño)	40	Valor Inicial: \$1.264.683.799 Etapa 1 \$35.695.510 Etapa 2 \$1.228.988.289 + \$65.167.769 (andenes, red de media tensión, red contra incendio, red de alcantarillado, ajuste de diseños, lavamanos de pedal y plataforma metálica para cuarto de basuras) + \$13.878.272 (ingreso aguas lluvias en área administrativa, angeo, señalización). Valor Final: \$1.343.729.840	20-Mar-18	5 meses + 45 días de prórroga + 15 días de prórroga	19-Oct-18	Ejecu: 100% Prog: 100%	<p>En correo electrónico del 21 de enero de 2019 se remitió a DAPRE certificación RETIE. Pendiente conexión eléctrica definitiva.</p> <p>Certificación RETILAP se encuentra en tramite.</p> <p><u>Procesos de incumplimiento ET 2: FINDETER solicitó a la interventoría pronunciamiento de los descargos presentados por el contratista de obra.</u></p>

Avance corte 20 de enero de 2019.




4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.2. Proyectos Terminados

PROYECTO	CAPACIDAD (NIÑOS)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN	FECHA TERM ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI Tierralta (Córdoba)	160	Valor Inicial: \$2.714.621.403 Etapa 1 \$28.798.000 Etapa 2 \$2.626.867.359 Altern. Sost. \$58.956.044 + \$100.444.841 (ajuste carpintería metálica, señalización, sistema BMS, apantallamiento y compuertas de tanque enterrado) Valor Total: \$2.815.066.244	25-Oct-17	6 meses + 60 días de prórroga + 60 días de prórroga + 30 días de prórroga	22-sept-18	Ejecu: 99,55% Prog: 100,00%	<p>Asesor externo de Findeter remitió concepto jurídico para definir actuaciones jurídicas contra los municipio que están incumpliendo sus obligaciones.</p> <p>En visita del 22 de enero de 2019 adelantada al CDI se verificó que ya se realizó traslado de los tableros eléctricos y los materiales de la red contraincendios ya se encuentran en obra.</p> <p><u>Proceso de incumplimiento ET1: cerrado</u></p> <p><u>Proceso de incumplimiento ET2: apremio por \$38.588.682</u></p> <p><u>Proceso de incumplimiento 2 ET2: pendiente de cierre.</u></p>

Avance corte 22 de enero de 2019.

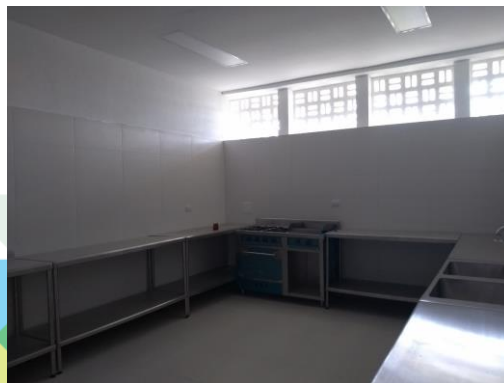

4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.2 Proyectos Terminados

PROYECTO	CAPACIDAD (NIÑOS)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN ETAPA 2	FECHA TERM ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI Yotoco (Valle del Cauca)	95	Valor Inicial: \$ 2.161.660.476 Etapa 1 \$36.955.450 Etapa 2 \$2.124.705.026 + \$43.550.976.00 (parques, señalización y lavamanos de pedal) Valor Final: \$ 2.205.211.452	23-Nov-17	5 meses + 2 meses prórroga + 2 meses prórroga	22-Ago-18	100%	<p>Se adelantaron obras en el cuarto eléctrico por solicitud de la empresa certificadora RETIE. Se adelantó mesa de trabajo entre Especialista Eléctrico y Empresa certificadora RETIE, se estima obtención de certificación para la primera semana de marzo.</p> <p>La Alcaldía no ha finalizado la obras eléctricas de la red de media tensión según ultimo requerimiento de la Empresa de Energía. En visita del 24 de enero de 2019, Findeter solicitó agilizar el tema.</p> <p>Se adelantó acta de entrega del proyecto con Embajada de Japón y Presidencia de la Republica el 24 de enero de 2019.</p> <p><u>Proceso de incumplimiento ET 2: el contratista objetó el acta de cierre del proceso de incumplimiento, el cual se encuentra en revisión de FINDETER.</u></p>

Avance corte 24 de enero de 2019.



4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.3 Proyectos Entregados en Liquidación

PROYECTO	CAPACIDAD (NIÑOS)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN ETAPA 2	FECHA TERM. ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI Potosí (Nariño)	95	Valor Inicial: \$2.571.268.745 Etapa 1: \$34.800.000 Etapa 2: \$2.494.588.570 inicial + \$41.880.175 (Alternativas de sostenibilidad) + \$68.675.353 (Dry Wall, señalización y parque) Valor Final: \$2.639.944.098	20-Jun-17	6 meses + 20 días de prórroga + 1 mes de prórroga	30-Ene-18	100%	Postventas: Contratista presentó informe con registro fotográfico de las subsanaciones adelantadas. Pendiente pronunciamiento formal del interventor. El 24 de enero de 2019 Findeter reiteró requerimiento a la Alcaldía.

Avance corte 24 de enero de 2019.



6. SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL - APORTES

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER S.A.
CONTROL DE SALDOS POR FUENTE DE RECURSOS
DICIEMBRE 31 DE 2018

APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068					
FUENTE	ENTIDAD	RECURSOS VIGENCIA 2016	RECURSOS VIGENCIA 2017	RECURSOS VIGENCIA 2018	VALOR TOTAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068	DAPRE	14.311.500.000,00	30.299.200.000,00	6.137.032.741,00	50.747.732.741,00
	MINCULTURA	1.866.000.000	-	-	1.866.000.000,00
	ECOPETROL	-	3.600.000.000,00	2.400.000.000,00	6.000.000.000,00
	ICBF	-	150.000.000,00	850.000.000,00	1.000.000.000,00
SUBTOTAL APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068					59.613.732.741,00
OTROS APORTES	JAPÓN	-	898.169.415,00	939.298.140,00	1.837.467.555,00
	CEMEX	-	402.325.200,00	150.000.000,00	552.325.200,00
	FONDO ABU DHABI	-	-	1.826.671.680,00	1.826.671.680,00
	EXCEDENTE BRICEÑO	-	-	10.963.333,00	10.963.333,00
	APREMIOS	-	-	-	-
SUBTOTAL OTROS APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068					4.227.427.768,00
TOTAL APORTES (Contrato Interadministrativo 068 y otros aportes)					63.841.160.509,00

Valor sin GMF

RECURSOS COMPROMETIDOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068	
VALOR CONTRATACIÓN + ADICIONES	54.338.469.692,73
VALOR ASISTENCIA TÉCNICA	5.433.846.969,27
DEVOLUCIÓN ECOPETROL	1.288.344.788,65
DEVOLUCIÓN ECOPETROL ABU DHABI	390.815.050,00
GMF RECURSOS ECOPETROL, ICBF Y CEMEX	29.684.008,00
ESTIMADO ADICIONES PENDIENTES	2.360.000.000,00
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	63.841.160.508,65

TOTAL RECURSOS SIN COMPROMETIDOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068	
APORTES - RECURSOS COMPROMETIDOS	0,35

6. SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL – RECURSOS RECIBIDOS

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER S.A.

CONTROL DE SALDOS POR FUENTE DE RECURSOS

DICIEMBRE 31 DE 2018

APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068				
FUENTE	ENTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR RECIBIDO	SALDO POR GIRAR
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068	DAPRE	50.747.732.741,00	47.535.700.000,00	3.212.032.741,00
	MINCULTURA	1.866.000.000,00	1.866.000.000,00	0
	ECOPETROL	6.000.000.000,00	3.600.000.000,00	2.400.000.000,00
	ICBF	1.000.000.000,00	450.000.000,00	550.000.000,00
VALOR RECURSOS RECIBIDOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		59.613.732.741,00	53.451.700.000,00	6.162.032.741,00

OTROS APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068				
FUENTE	ENTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR RECIBIDO	SALDO POR GIRAR
OTROS APORTES	JAPÓN	1.837.467.555,00	1.837.467.555,00	0,00
	CEMEX	552.325.200,00	552.325.200,00	0,00
	FONDO ABU DHABI	1.826.671.680,00	1.826.671.680,00	0,00
VALOR RECURSOS RECIBIDOS OTROS APORTANTES		4.216.464.435,00	4.216.464.435,00	0,00

VALOR TOTAL RECURSOS RECIBIDOS CI Y OTROS APORTES	63.830.197.176,00	57.668.164.435,00	6.162.032.741,00
---------------------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

6. SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL – RECURSOS CAUSADOS

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER S.A.

CONTROL DE SALDOS POR FUENTE DE RECURSOS

DICIEMBRE 31 DE 2018

TOTAL APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068				
FUENTE	ENTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR CAUSADO POR LA FIDUCIARIA A TERCEROS	VALOR PENDIENTE POR GIRAR A TERCEROS
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068	DAPRE	50.747.732.741,00	39.449.502.387,00	11.298.230.354,00
	MINCULTURA	1.866.000.000,00	1.623.915.400,00	242.084.600,00
	ECOPETROL	6.000.000.000,00	1.016.820.730,00	4.983.179.270,00
	ICBF	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00
OTROS APORTES	JAPÓN	1.837.467.555,00	1.837.467.555,00	-
	CEMEX	552.325.200,00	-	552.325.200,00
	FONDO ABU DHABI	1.826.671.680,00	1.826.671.680,00	-
TOTAL		63.830.197.176,00	45.754.377.752,00	18.075.819.424,00



Findeter

Financiera del Desarrollo

JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINHACIENDA



MINCULTURA



BIENESTAR
FAMILIAR



ecopETROL
