

COMITÉ EJECUTIVO No. 056 DAPRE -
MINISTERIO DE CULTURA –
ECOPETROL - ICBF
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
No. 068/16



INFRAESTRUCTURA



Findeter
Financiera del Desarrollo

\$63.854

Millones

25

Proyectos

16

Departamentos

25

Municipios

14 de marzo de 2019

JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE



CDI ENTREGADOS

25 PROYECTOS
2.609 BENEFICIARIOS
\$64.268 MILLONES DE INVERSION TOTAL



CDI ENTREGADOS

25 PROYECTOS
2.609 BENEFICIARIOS
\$ 64.268 MILLONES DE INVERSIÓN TOTAL



CDI ENTREGADOS

25 PROYECTOS
2.609 BENEFICIARIOS
\$ 64.268 MILLONES DE INVERSION TOTAL



CDI TERMINADOS

25 PROYECTOS

2.609 BENEFICIARIOS

\$ 64.268 MILLONES DE INVERSION TOTAL



INFRAESTRUCTURA EN ENTORNOS INSTITUCIONALES Y CULTURALES

1. Verificación del quorum
2. Estado de los Compromisos
3. Resumen Gestión de los Proyectos.
4. Estado de gestión de los proyectos viabilizados.
 - 4.1. Proyectos Terminados
 - 4.3. Proyectos Entregados en Liquidación
5. Seguimiento presupuestal
6. Propositiones y varios.



1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

De acuerdo al Parágrafo Primero – Quorum de la Cláusula Novena – Comité Ejecutivo del Contrato Interadministrativo 068 de 2016 y sus respectivos modificatorios, suscritos entre el DAPRE, el MINISTERIO DE CULTURA, ECOPETROL, el ICBF y la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER y FIDUCIARIABOGOTÁ S.A., la cual establece:

PARÁGRAFO PRIMERO: QUORUM: Tanto el **MINCULTURA** como **ECOPETROL** solo participarán en las sesiones del Comité Ejecutivo donde se tomen decisiones frente a la formulación y/o ejecución de proyectos en los que participan. Por su parte, **ICBF** podrá ser convocado como parte de este comité en las sesiones donde se tomen decisiones frente a los proyectos para los cuales realice aportes o podrá asistir como Entidad invitada cuando se requiera. En consecuencia, se constituirá el quorum del Comité Ejecutivo con la asistencia de la mayoría de los miembros convocados, al menos uno de los cuales debe ser un delegado del **DAPRE**. La asistencia no requiere ser presencial, pues uno o varios de los delegados podrán participar por teleconferencia, videoconferencia o cualquier otro medio semejante que permita a todos escuchar lo que se discute y manifestarse de forma inequívoca. En caso de asistencia no presencial, se dejará constancia en el acta de la reunión, anexando copia de la comunicación física o electrónica que la confirme.

PARÁGRAFO SEGUNDO: QUORUM EXCEPCIONAL: Cuando en alguna sesión o en cualquier momento de una sesión solo se vayan a tratar proyectos en cuya financiación no participen **MINCULTURA**, **ICBF** ni **ECOPETROL**, el quorum se constituirá con la asistencia del delegado de **FINDETER** y al menos un delegado del **DAPRE**.

2. ESTADO DE COMPROMISOS


No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
1	Remisión de actas de Comité Ejecutivo	FINDETER	No. 044: suscrita por DAPRE, pendiente firma FINDETER No. 045: En firma por ICBF No. 046: DAPRE remitió observaciones el 13/03/2019 No. 047: se remitió para firma de DAPRE 14/03/2019 No. 049: En firma de DAPRE No. 050: En revisión de DAPRE 18/02/2019 No. 051: En revisión de DAPRE 19/02/2019 No. 053: No. 054: En firma de DAPRE No. 055: En revisión de DAPRE 21/02/2019	EN PROCESO
2	<ul style="list-style-type: none"> DAPRE y FINDETER deben contactar al alcalde de Valencia para presionar por sus respectivos compromisos: transformador y acometida eléctrica. Remisión comunicaciones a los municipios (Tierralta y Valencia) con plazo perentorio para la conexión de los servicios públicos. 	FINDETER y DAPRE	El 7 de marzo de 2019 se venció plazo perentorio otorgados a las alcaldías. Se prepara documentación soporte para solicitar el inicio de acciones judiciales a la Dirección Jurídica de Findeter.	EN PROCESO
3	ICBF continuará gestionando los temas con la alcaldía de Vélez sobre la fábrica de bocadillos y la caldera.	ICBF	Pendiente remisión información de avance por parte de ICBF	EN PROCESO
4	Para los proyectos SIPI y LITORAL, FINDETER debe confirmar al DAPRE y a MINCULTURA que el acta de liquidación se finalice durante el mes de septiembre de 2018.	FINDETER	En reporte del 11 de marzo de 2019 se remitió estado de liquidaciones.	EN PROCESO

2. ESTADO DE COMPROMISOS

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	ESTADO ACTUAL	
5	Informar sobre el concepto de Electricaribe sobre el proyecto eléctrico en San Pedro.	FINDETER	Electricaribe presentó pronunciamiento el 12 de marzo de 2019. Se coordina reunión entre Electricaribe y consultor eléctrico para cerrar las 2 observaciones pendientes.	EN PROCESO
6	Contratación cubierta (posventas aguas lluvias) CDI La Montañita	FINDETER	Términos de Referencia en elaboración por la Dirección de Contratación. El 15 de marzo de 2019 se celebrará comité de contratación.	EN PROCESO
7	DAPRE coordinará reunión con ECOPETROL y Findeter para el nuevo contrato interadministrativo de los proyectos financiados con el aporte del Fondo Abu Dhabi.	DAPRE	Se adelantó reunión el 1 de marzo de 2019	CERRADO
8	Findeter remitirá a DAPRE e ICBF el informe de subsanación de posventas del CDI de Apartadó	FINDETER	En comunicación No.220193300028689 del 12 de marzo de 2019 se remitió informe de subsanación a DAPRE con copia a ICBF. Adicionalmente se remitió comunicado No. 220193300028019 del 25 de febrero de 2019 al municipio requiriéndole subsanar.	CERRADO
9	DAPRE e ICBF realizarán los desembolsos de las cuentas por pagar, radicadas por Findeter en el mes de diciembre de 2018.	DAPRE ICBF	En correo electrónico del 12 de marzo de 2019, Fidubogotá confirmó el ingreso de recursos del ICBF. El 18 de febrero de 2018, ingresaron los recursos por parte de DAPRE.	CERRADO
10	DAPRE consultará jurídicamente si es posible recibir la infraestructura sin la totalidad de los servicios públicos, teniendo en cuenta los tres escenarios presentados en el comité ejecutivo No. 54 del 25 de enero de 2019.	DAPRE	DAPRE continua revisando jurídicamente el tema	EN PROCESO

3. RESUMEN GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

ESTADO GENERAL 25 PROYECTOS

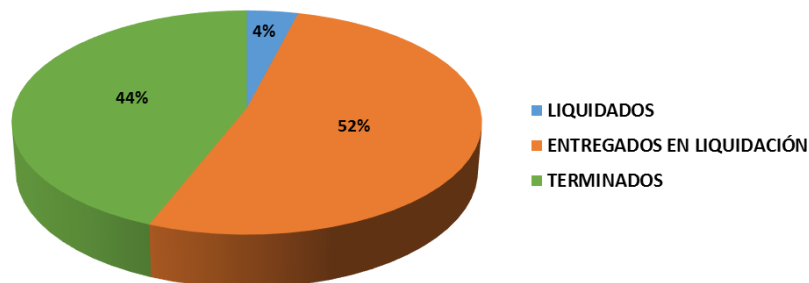


ESTADO/ MUNICIPIO	N° PROYECTOS
LIQUIDADOS	1
BRICEÑO - PUEBLO NUEVO (ANTIOQUIA)	1
ENTREGADOS EN LIQUIDACIÓN	13
MOCOA ETAPA 1 (PUTUMAYO)	1
LETICIA (AMAZONAS)	1
SIPÍ (CHOCÓ)	1
LITORAL DEL SAN JUAN (CHOCÓ)	1
POTOSÍ (NARIÑO)	1
MACEDONIA (AMAZONAS)	1
ZONA BANANERA (MAGDALENA)	1
TESALIA (HUILA)	1
APARTADÓ (ANTIOQUIA)	1
LA MONTAÑITA (CAQUETÁ)- (Recibido por la Alcaldía)	1
BAHÍA PORTETE (GUAJIRA)	1
SAN LORENZO (NARIÑO)	1
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (CAQUETÁ)	1
TERMINADOS	11
VALENCIA (CÓRDOBA)	1
YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)	1
TIERRALTA (CÓRDOBA)	1
SAN PEDRO (SUCRE)	1
POLICARPA (NARIÑO)	1
ANAPOIMA (CUNDINAMARCA)	1
EL DONCELLO (CAQUETÁ)	1
EL PAUJIL (CAQUETÁ)	1
CLEMENCIA (BOLIVAR)	1
TEORAMA (NORTE DE SANTANDER)	1
VÉLEZ (SANTANDER)	1
EN ETAPA DE PRECONTRACTUAL	FECHA ESTIMADA INICIO
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MONTAÑITA	1/05/2019
TOTAL GENERAL	25

4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.1 Proyectos Terminados

PROYECTO	CAPACIDAD (NIÑOS)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN	FECHA TERM ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI Clemencia (Bolívar)	160	Valor Inicial: 3.439.296.855 Etapa 1 \$12.449.040 Etapa 2 \$3.426.847.815 + \$662.506.440 (muro de contención, estabilización y demolición, escorrentías, muros de cerramiento colegio, obras provisionales aguas escorrentías, base de tanque, tanque séptico, baranda de seguridad pozo eyector, traslado acometida y cajas eléctrica) + \$227.473.373,00 (impermeabilización, piso en caucho para juegos infantiles, señalización y placa en contrapiso). Valor Final: \$4.329.276.668	21-Dic-17	6 meses + 3 meses de prórrogas + 45 días de prórroga	26-Ene-19	Ejecu: 96% Prog: 100,00%	<p>Se adelantó visita por Findeter el 11 de marzo de 2019 para verificación previa a la entrega del proyecto con contratista e interventor, se encontraron detalles por subsanar y se realizó el respectivo requerimiento.</p> <p>Electricaribe informó que el 18 de marzo de 2019 adelantará revisión final para la conexión definitiva. Se estima que en la primera semana de abril se contará con el servicio eléctrico definitivo</p> <p><u>Procesos de incumplimiento ET2: Cerrado</u></p>

Avance corte 11 de marzo de 2019

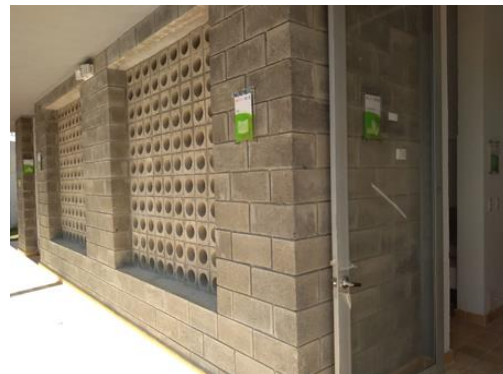

4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.1 Proyectos Terminados

PROYECTO	CAPACIDAD (NIÑOS)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN ETAPA 2	FECHA TERM ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI Teorama (Norte de Santander)	65	Valor Inicial: \$1.375.043.676,00 Etapa 1: \$35.125.730 Etapa 2: \$1.339.917.946 +\$33.297.470 (andenes) Valor Final: \$1.408.341.146,00	8-mar-18	4 meses + 37 días de suspensión + 60 días prórroga + 20 días suspensión + 30 días de prórroga+ 20 días suspensión+ 15 días de prórroga	30-Ene-2019	Ejec: 91% Prog: 100%	<p>Se continúa en la ejecución de las actividades eléctricas e hidrosanitarias.</p> <p>Findeter programó visita para el 27 de marzo de 2019 con ICBF, la cual se adelantará sino ocurren situaciones extraordinarias relacionadas con el orden público de la región.</p> <p><u>Proceso de incumplimiento ET 2: N/A.</u></p>

Avance corte 12 de marzo de 2019



4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.1 Proyectos Terminados

PROYECTO	CAPACIDAD (niños)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN	FECHA TERM ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI Vélez (Santander)	160	Valor Inicial: \$3.606.250.622,00 Etapa 1 \$36.955.700 Etapa 2 \$3.569.294.922 + \$205.263.121,00 (muros de contención, puntos de agua caliente, calentador a gas, lavamanos de pedal, piso en vidrio de seguridad, sistema fotovoltaico y parque) + \$9.675.295.00 (señalización) Valor Final: \$3.821.189.038,00	2-Abr-18	5 meses y 15 días + 5,5 meses de prórroga	28-Feb-2019	Ejecu: 94% Prog: 100%	<p>Continúan con la instalación del cieloraso, pintura, carpintería metálica y demás acabados.</p> <p>Se dio tramite a desembolso dentro de plazo extraordinario con el fin de garantizar flujo de caja y se está tramitando un nuevo desembolso con cargo a los recursos del ICBF ingresados el 12 de marzo de 2019</p> <p><u>Proceso de incumplimiento ET 1: cerrado.</u></p> <p><u>Proceso de incumplimiento ET 2: se aprobó en Comité Fiduciario No. 073 del 24 de septiembre de 2018 la aplicación de la Cláusula Penal de Apremio por valor de \$68.518.762,00.</u></p>

Avance corte 11 de marzo de 2019



4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.1 Proyectos Terminados

PROYECTO	CAPACIDAD (NIÑOS)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN	FECHA TERM ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI Anapoima (Cundinamarca)	95	Valor Inicial: \$2.105.557.993 Etapa 1 \$34.510.000 Etapa 2 \$2.071.047.993 + \$460.671.702 (sistema fotovoltaico, carpintería metálica, pañete, pintura, mampostería, piso en baldosín, mortero de nivelación, guardaescobas, placa de cubierta, acero de refuerzo, puerta entamborada, columnas, bordillo, mesones e impermeabilización) + \$149.665.897,57 (acceso al CDI, muros de cerramiento y placas en concreto) + \$22.602.221,54 (señalización y parque) Valor Final: \$2.738.497.814,11	22-Mar-18	5 meses + 2 meses de prórroga + 15 días prórroga	6-Nov-18	Ejecu: 99,5% Prog: 100,00%	Mediante correo del 11 de marzo de 2019 se remitió certificación RETIE a DAPRE. Contratista informa que en la presente semana entregan certificación RETILAP. Alcaldía informó que en la presente semana se inician actividades de la red de gas en el proyecto y estiman que estén finalizadas la próxima semana. <u>Proceso de incumplimiento ET 1: cerrado.</u>

Avance corte de 12 de marzo de 2019



4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.1 Proyectos Terminados

PROYECTO	CAPACIDAD (NIÑOS)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN ETAPA 2	FECHA TERM ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI San Pedro (Sucre)	95	Valor Inicial: \$2.386.999.603 Etapa 1 \$35.919.550 Etapa 2 \$2.351.080.053 + \$215.755.533 (esp. Carpintería metálica, pozo eyector, andén perimetral, apantallamiento y red de media tensión). + \$57.619.030,00 (señalización, sistema BMS y persianas). Valor Final: \$2.660.374.166	22-Feb-18	5 meses + 60 días de prórroga + 20 días de prórroga	10-Oct-18	Ejecu: 98,50% Prog: 100,00%	<p>El 12 de marzo de 2019 Electricaribe se pronunció sobre la ultima radicación del proyecto eléctrico. Se presentan 2 observaciones, las cuales ya fueron remitidas al consultor.</p> <p>Findeter coordina teleconferencia con Electricaribe y consultoría eléctrica para solucionar la situación.</p> <p><u>Proceso de incumplimiento ET1: Cerrado</u> <u>Proceso de incumplimiento ET2: Se procederá el cierre de los incumplimientos teniendo en cuenta que el contratista subsanó las observaciones.</u></p>

Avance corte 12 de marzo de 2019



4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.1 Proyectos Terminados

PROYECTO	CAPACIDAD (NIÑOS)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN	FECHA TERM ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI Policarpa (Nariño)	40	Valor Inicial: \$1.264.683.799 Etapa 1 \$35.695.510 Etapa 2 \$1.228.988.289 + \$65.167.769 (andenes, red de media tensión, red contra incendio, red de alcantarillado, ajuste de diseños, lavamanos de pedal y plataforma metálica para cuarto de basuras) + \$13.878.272 (ingreso aguas lluvias en área administrativa, angeo, señalización). Valor Final: \$1.343.729.840	20-Mar-18	5 meses + 45 días de prórroga + 15 días de prórroga	19-Oct-18	Ejecu: 100% Prog: 100%	<p>Mediante correo electrónico del 15 de febrero de 2019, se remitió al DAPRE la certificación RETILAP, se continua el tramite de la conexión eléctrica definitiva.</p> <p>Empresa de energía informó de manera telefónica que después del 15 de marzo de 2019 realizará la conexión.</p> <p><u>Procesos de incumplimiento ET 2: Cerrado.</u></p>

Avance corte 12 de marzo de 2019



4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.1 Proyectos Terminados

PROYECTO	CAPACIDAD (NIÑOS)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN	FECHA TERM ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI Tierralta (Córdoba)	160	Valor Inicial: \$2.714.621.403 Etapa 1 \$28.798.000 Etapa 2 \$2.626.867.359 Altern. Sost. \$58.956.044 + \$100.444.841 (ajuste carpintería metálica, señalización, sistema BMS, apantallamiento y compuertas de tanque enterrado) Valor Total: \$2.815.066.244	25-Oct-17	6 meses + 60 días de prórroga + 60 días de prórroga + 30 días de prórroga	22-sept-18	Ejecu: 99,5% Prog: 100,00%	<p>Se requiere la suma de \$ 62.256.545 para la ejecución de las actividades pendientes en el proyecto de Tierralta, que no son de carácter contractual y que corresponden a: 1) instalación de campana extractora (por valor de \$ 7.296.913); 2) instalación de red contraincendios (por valor de \$ 50.228.583); y 3) traslado de tableros eléctricos en el cuarto de bombas (por valor de \$ 4.731.049). Estas actividades serán objeto de reconocimiento y pago contra acta de liquidación, y su valor será asumido con los recursos del apremio que se descontará al contratista por valor de \$38.588.682, y el excedente, esto es \$23.667.863, con cargo a los recursos disponibles en el contrato interadministrativo No. 068 de 2016.</p> <p>Por consiguiente se requieren \$23.667.863 con cargo al contrato interadministrativo.</p> <p>Con lo anterior, se aclara lo informado en el acta del comité ejecutivo No.52 donde se informó que se requerían 32 millones para las actividades mencionadas y otras.</p> <p><u>Proceso de incumplimiento ET1: cerrado</u></p> <p><u>Proceso de incumplimiento ET2: apremio por \$38.588.682</u></p> <p><u>Proceso de incumplimiento 2 ET2:cerrado</u></p>

Avance corte 11 de marzo de 2019

ITEMS ADICIONALES	VALOR
TRASLADO DE TABEROS ELECTRICOS CUARTO DE BOMBAS	\$ 4.731.049
CAMPANA EXTRACTORA COCINA	\$ 7.296.913
RED CONTRA INCENDIOS	\$ 50.228.583
VALOR TOTAL (DIRECTO+INDIRECTO+IVA/U)	\$ 62.256.545

FUENTE RECURSOS	VALOR
RECURSOS DESCUENTO DEL APREMIO	\$38.588.682
RECURSOS DEL CONTRATO INTERADM. 068	\$23.667.863
TOTAL	\$62.256.545

4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.1 Proyectos Terminados

PROYECTO	CAPACIDAD (NIÑOS)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN ETAPA 2	FECHA TERM ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI Yotoco (Valle del Cauca)	95	Valor Inicial: \$ 2.161.660.476 Etapa 1 \$36.955.450 Etapa 2 \$2.124.705.026 + \$43.550.976.00 (parques, señalización y lavamanos de pedal) Valor Final: \$ 2.205.211.452	23-Nov-17	5 meses + 2 meses prórroga + 2 meses prórroga	22-Ago-18	100%	<p>En visita del 11 de marzo de 2019, la empresa certificadora informó que requería la certificación RETIE de la red de media tensión para poder expedir el certificado de la red interna.</p> <p>El municipio en solicitud telefónica manifestó que requiere de carácter urgente recibir la obra por un tema relacionado con la disponibilidad de recursos para la operación del CDI (ICBF Regional) que se encuentra próximo a vencerse. El teleconferencia del 13/03/2019 con DAPRE y Findeter, la alcaldesa se comprometió a presentar una solicitud formal al respecto el 14/03/2019.</p> <p><u>Proceso de incumplimiento ET 2: el contratista objetó el acta de cierre del proceso de incumplimiento, el cual se encuentra en revisión de FINDETER.</u></p>

Avance corte 12 de marzo de 2019.



4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.3 Proyectos Entregados en Liquidación

PROYECTO	CAPACIDAD (NIÑOS)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN ETAPA 2	FECHA TERM. ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI Potosí (Nariño)	95	Valor Inicial: \$2.571.268.745 Etapa 1: \$34.800.000 Etapa 2: \$2.494.588.570 inicial + \$41.880.175 (Alternativas de sostenibilidad) + \$68.675.353 (Dry Wall, señalización y parque) Valor Final: \$2.639.944.098	20-Jun-17	6 meses + 20 días de prórroga + 1 mes de prórroga	30-Ene-18	100%	Postventas: Municipio no se ha pronunciado frente a los requerimientos de FINDETER. Se recomienda al ICBF hacerle seguimiento a la situación teniendo en cuenta que el CDI se encuentra en operación.

Avance corte 11 de marzo de 2019.



4. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

4.3 Proyectos Entregados en Liquidación

PROYECTO	CAPACIDAD (NIÑOS)	VALOR	FECHA INICIO ETAPA 2	DURACIÓN ETAPA 2	FECHA TERM. ETAPA 2	AVANCE %	ACTIVIDADES ADELANTADAS A LA FECHA
CDI Apartadó (Nariño)	95	Valor Inicial: \$2.571.268.745 Etapa 1: \$34.800.000 Etapa 2: \$2.494.588.570 inicial + \$41.880.175 (Alternativas de sostenibilidad) + \$68.675.353 (Dry Wall, señalización y parque) Valor Final: \$2.639.944.098	20-Jun-17	6 meses + 20 días de prórroga + 1 mes de prórroga	30-Ene-18	100%	<p>Postventas:</p> <ul style="list-style-type: none">- El 18 de febrero de 2019 se realizó visita por parte de Findeter, ICBF, contratista de obra y alcaldía.- El contratista adelantó subsanaciones y se remitió informe a DAPRE con copia a ICBF.- Durante la visita se evidenció presencia de maleza y desechos en los canales aledaños donde se desaguan las aguas lluvias, así como presencia de materiales de una obra aledaña que están siendo almacenados en el CDI. Por lo anterior, se remitió comunicado a la alcaldía de Apartadó. Se recomienda a ICBF y DAPRE realizar los respectivos requerimientos a DAPRE.

Avance corte 11 de marzo de 2019



Obstrucción del canal

6. SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL - APORTES

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER S.A.

CONTROL DE SALDOS POR FUENTE DE RECURSOS

MARZO 14 DE 2019

APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068					
FUENTE	ENTIDAD	RECURSOS VIGENCIA 2016	RECURSOS VIGENCIA 2017	RECURSOS VIGENCIA 2018	VALOR TOTAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068	DAPRE	14.311.500.000,00	30.299.200.000,00	6.137.032.741,00	50.747.732.741,00
	MINCULTURA	1.866.000.000	-	-	1.866.000.000,00
	ECOPETROL	-	3.600.000.000,00	2.400.000.000,00	6.000.000.000,00
	ICBF	-	150.000.000,00	850.000.000,00	1.000.000.000,00
SUBTOTAL APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068					59.613.732.741,00
OTROS APORTES	JAPÓN	-	898.169.415,00	939.298.140,00	1.837.467.555,00
	CEMEX	-	402.325.200,00	150.000.000,00	552.325.200,00
	FONDO ABU DHABI	-	-	1.826.671.680,00	1.826.671.680,00
	EXCEDENTE BRICEÑO	-	-	10.963.333,00	10.963.333,00
	APREMIOS	-	-	-	-
SUBTOTAL OTROS APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068					4.227.427.768,00
TOTAL APORTES (Contrato Interadministrativo 068 y otros aportes)					63.841.160.509,00
Valor sin GMF					

RECURSOS COMPROMETIDOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068	
VALOR CONTRATACIÓN + ADICIONES	54.304.667.230,00
VALOR ASISTENCIA TÉCNICA	5.430.466.723,00
DEVOLUCIÓN ECOPETROL	1.288.344.788,65
DEVOLUCIÓN ECOPETROL ABU DHABI	390.815.050,00
GMF RECURSOS ECOPETROL, ICBF Y CEMEX	29.684.008,00
ESTIMADO ADICIONES PENDIENTES	2.360.000.000,00
CONTRATACIÓN MONTAÑA	41.369.597,00
(instalación cubierta y manejo de aguas lluvias)	
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	63.803.977.799,65

TOTAL RECURSOS SIN COMPROMETIDOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068	
APORTES - RECURSOS COMPROMETIDOS	37.182.709,35

6. SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL – RECURSOS RECIBIDOS

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER S.A.

CONTROL DE SALDOS POR FUENTE DE RECURSOS

MARZO 14 DE 2019

APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068				
FUENTE	ENTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR RECIBIDO	SALDO POR GIRAR
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068	DAPRE	50.747.732.741,00	50.460.700.000,00	287.032.741,00
	MINCULTURA	1.866.000.000,00	1.866.000.000,00	0
	ECOPETROL	6.000.000.000,00	3.600.000.000,00	2.400.000.000,00
	ICBF	1.000.000.000,00	750.000.000,00	250.000.000,00
VALOR RECURSOS RECIBIDOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		59.613.732.741,00	56.676.700.000,00	2.937.032.741,00

OTROS APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068				
FUENTE	ENTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR RECIBIDO	SALDO POR GIRAR
OTROS APORTES	JAPÓN	1.837.467.555,00	1.837.467.555,00	0,00
	CEMEX	552.325.200,00	552.325.200,00	0,00
	FONDO ABU DHABI	1.826.671.680,00	1.826.671.680,00	0,00
VALOR RECURSOS RECIBIDOS OTROS APORTANTES		4.216.464.435,00	4.216.464.435,00	0,00

VALOR TOTAL RECURSOS RECIBIDOS CI Y OTROS APORTES		63.830.197.176,00	60.893.164.435,00	2.937.032.741,00
--	--	-------------------	-------------------	------------------

6. SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL – RECURSOS CAUSADOS

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER S.A.
CONTROL DE SALDOS POR FUENTE DE RECURSOS
DICIEMBRE 31 DE 2018

TOTAL APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068				
FUENTE	ENTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR CAUSADO POR LA FIDUCIARIA A TERCEROS	VALOR PENDIENTE POR GIRAR A TERCEROS
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068	DAPRE	50.747.732.741,00	39.449.502.387,00	11.298.230.354,00
	MINCULTURA	1.866.000.000,00	1.623.915.400,00	242.084.600,00
	ECOPETROL	6.000.000.000,00	1.016.820.730,00	4.983.179.270,00
	ICBF	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00
OTROS APORTES	JAPÓN	1.837.467.555,00	1.837.467.555,00	-
	CEMEX	552.325.200,00	-	552.325.200,00
	FONDO ABU DHABI	1.826.671.680,00	1.826.671.680,00	-
TOTAL		63.830.197.176,00	45.754.377.752,00	18.075.819.424,00

Aprox. Pagos Enero	1.100.000.000,00
Aprox. Pagos Febrero	900.000.000,00
Aprox. Pagos Marzo	500.000.000,00
TOTAL	2.500.000.000,00*

TOTAL APROXIMADO	63.830.197.176,00	48.254.377.752,00	15.575.819.424,00
------------------	-------------------	-------------------	-------------------

* CIFRA EN VERIFICACIÓN POR EL ÁREA DE CONTROL A FIDUCIAS



Findeter

Financiera del Desarrollo

JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINHACIENDA



MINCULTURA



BIENESTAR
FAMILIAR



ecopETROL
