	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INFORME DE COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO	F12.P5.GTH	06/02/2018
		Versión 3	Página 1 de 12

FECHA	14 de febrero de 2019
LUGAR	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE BELEN Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE TOTA (Boyacá)

COMISIONADO (S):

Nombre	Cargo	Dependencia	Número de Resolución	Fecha de Resolución
Sonia Stella Rincón F.	Contratista Ingeniera Civil	Grupo Administrativo	N° 0410 R.M. N° 0163	Del 12 de febrero de 2019 Del 13 de febrero de 2019

OBJETIVO:

"Realizar visita a las Instalaciones de los CDI'S de los Municipios de Tota y Belén, que han terminado su construcción para verificar que se hayan subsanado las observaciones dadas en la visita de junio del año pasado, para que sean recibidos por Primera Infancia, visita que se realiza a solicitud de la Sede Nacional."

PARTICIPANTES:

Ing. Edgar A. Barrote Secretario de Obras de Belén.
Téc. Yefer Camilo Vargas P. Apoyo de Secretario de Obras de Belén.
Ing. Sonia Rincón Apoyo - Infraestructura del ICBF Regional Boyacá.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

DESARROLLO:


1. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE BELEN:

El día 14 de febrero del presente año, nuevamente se visita la infraestructura del CDI de Belén para verificar si se realizaron las observaciones anotadas en la visita del 21 de junio del 2018.

Se realiza el recorrido en compañía del Ing. Edgar A. Barrote Secretario de Obras de Belén y el Téc. Yefer Camilo Vargas P. Apoyo de Secretario de Obras de Belén, observando que estos arreglos no se realizaron en su totalidad en este momento se observa que hacen falta dos lámparas que se habían instalado en el pasillo del bloque 4; a esto manifiesta el Ing. Edgar A. Barrote Secretario de Obras de Belén, que me tenía que contar que al CDI se entraron amigos de lo ajeno, perjudicando las instalaciones porque se llevaron todo el cableado eléctrico No. 10,

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considerará como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INFORME DE COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO	F12.P5.GTH	06/02/2018
		Versión 3	Página 2 de 12

por lo que la Administración decidió realizar un contrato de obra para reponer dicho cable, pero después de unos días se volvió a presentar otro robo y esta vez se llevaron la tubería de cobre que sale de la caja de apantallamiento a cada uno de los pararrayos de la infraestructura. Y en el momento de revisar la infraestructura. Al observar que faltaban las lámparas le informé que también debían reponer estas lámparas que según el inventario del día de entrega todos los pasillos tenían instaladas lámparas, el ing. Edgar manifiesta que esto lo solucionara buscando en el almacén de la Administración Municipal porque ya tiene el contrato del cable y la tubería de cobre y que muy posiblemente se termine la instalación de este cable y tubería la semana entrante.


Se revisan los espacios donde se realizaron unas observaciones para que fueran subsanadas por el contratista, estas observaciones fueron:

- Las chapas de las puertas en los baños del comedor se deben retirar o echarle algún material que las inmovilice. Si se cumplió, se instaló silicona en los seguros parte interna de las puertas.
- El piso de la cocina se encuentra muy manchado lo deben desmanchar. No se pudo observar por presentar tanta tierra y polvo.
- Instalar tapas a tomas corrientes que se encuentran a una altura de 1,4 m. en baños de sala cuna y en aula múltiple. No se cumplió.
- Se debe definir el pago de celaduría y servicios para el CDI al momento de realizar contrato con operador. La Celaduría quedo bajo responsabilidad de la Administración Municipal, cuando FONADE hizo entrega de las llaves el día 21 de junio de 2018. Nos se cumplió y por eso amigos de los ajeno entraron y robaron.
- El cuarto de hidroneumático no coincide en cuanto a las medidas con la norma GIPI 2016 del ICBF. Quedo de ese tamaño según diseño entregado por FONADE al Contratista.
- Pared en la zona de transición presenta fisura al lado de la ventana, fisura que debe quedar resanada por el Contratista. Se cumplió, realizaron resane de fisura, pero ya se empezó a dilatar, además falto detallar el estuco por falta de lija.
- Instalar la estufa a gas. Si se cumplió.
- Se lijo y limo los mobillarios en acero inoxidable que se encuentran en la cocina que presentaban rebaba que era un riesgo de accidente para los empleados. Si se cumplió.
- A los calentadores de agua en las baterías de baños se le debe colocar un tubo espiral que recubra los cables eléctricos, para evitar cualquier tipo de accidente. No se cumplió.
- Cambio de ducha tipo ganso a ducha teléfono en espacio de cambia pañales de sala cuna. No se Cumplió

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012


	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INFORME DE COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO	F12.P5.GTH	06/02/2018
		Versión 3	Página 3 de 12

Al finalizar la revisión de la infraestructura se les solicita hacer llegar vía correo electrónico los documentos que tengan con respecto a la entrega del CDI, como son el acta que FONADE realizó el día de la entrega de las llaves del CDI, el inventario que se realizó a la infraestructura de todos los mobiliarios, elementos y equipos instalados, certificado RETIE y certificaciones de servicios.


CONCLUSIONES:

- Se solicita a la Administración Municipal, realizar contrato de obra para la reposición del cableado eléctrico de acuerdo a lo que figura en el certificado RETIE, además instalará toda la tubería de cobre desde las cajas de apantallamiento hasta los pararrayos empotrados en las cubiertas.


REGISTRO FOTOGRAFICO VISITA CDI EN EL MUNICIPIO DE BELEN

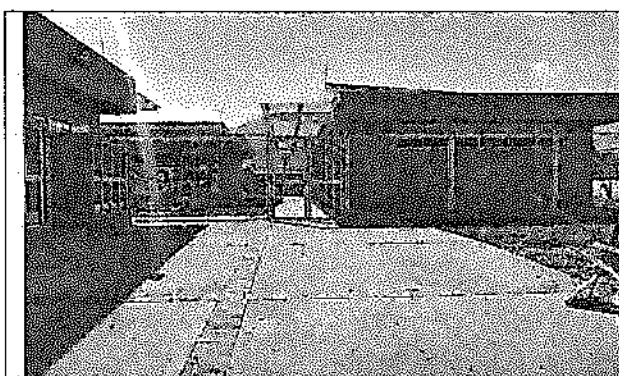


Fachada CDI de Belén.

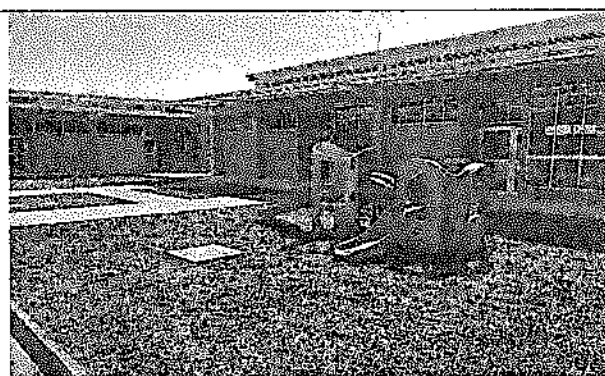

En la zona verde donde se encuentra el parque infantil para la diversión de los NN, se le realizó limpieza.

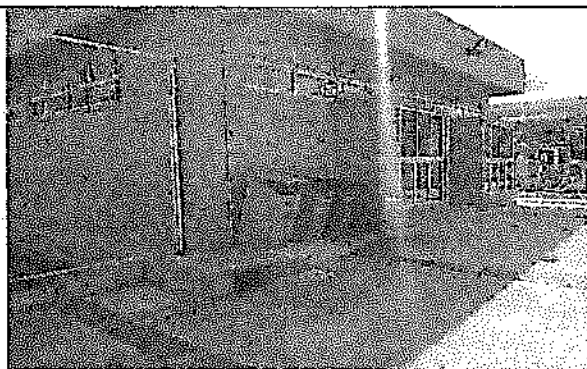

El CDI cuenta con puntos ecológicos

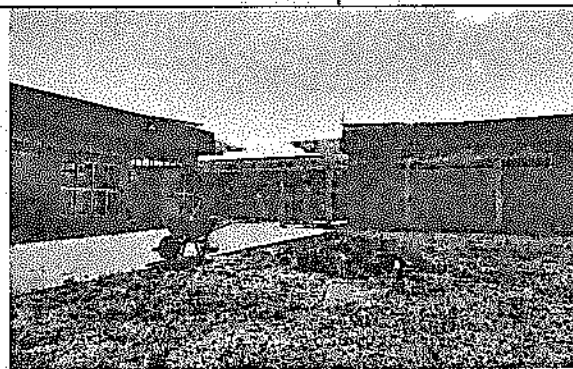


Limpieza de zonas verdes por parte de la Administración Municipal.


Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.


LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

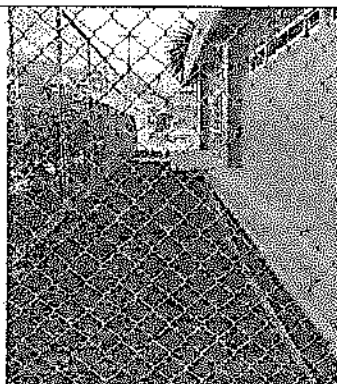


Zonas verdes limpias de maleza.

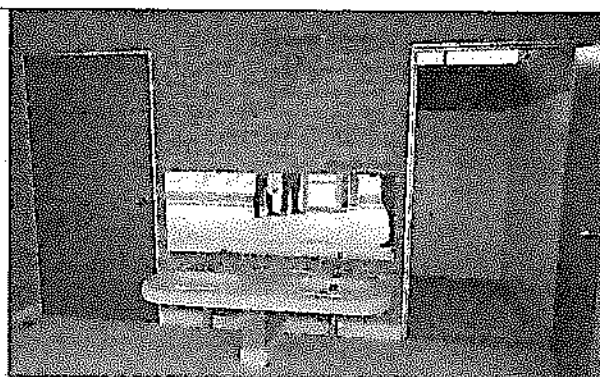


Puertas de baños en salón comedor que se les bloqueo los seguros con silicona líquida.

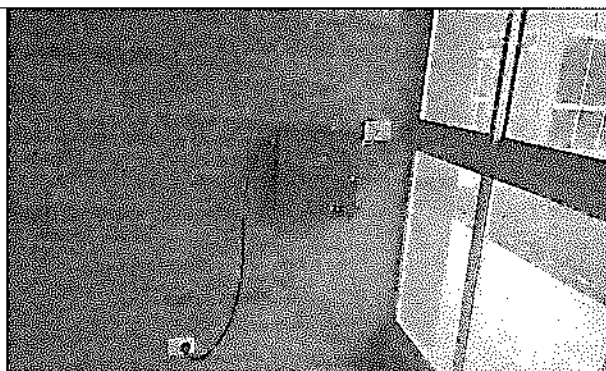


Tablero de circuitos de Contra incendio ubicado en la oficina de Coordinación

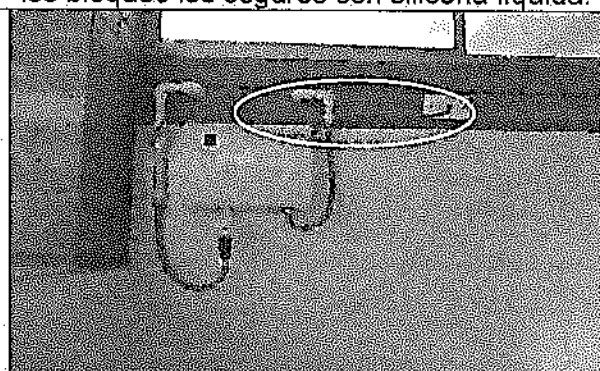

Cables eléctricos que no se les instaló el tubo espiral de recubrimiento para mayor protección.

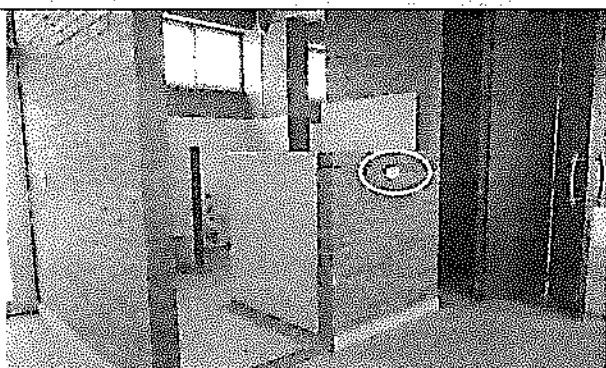

Aula múltiple con puerta en madera corredera, en la entrada a baños existen dos tomas corrientes a una altura de 1,2 m. que no se les instaló la tapa lisa para que queden eliminados.

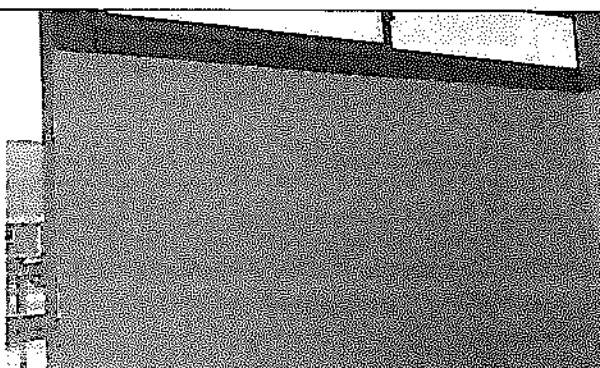


Pared en sala cuna que presentaba fisura, fue reparada pero ya empieza a dilatarse por donde realizaron el resane.


Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

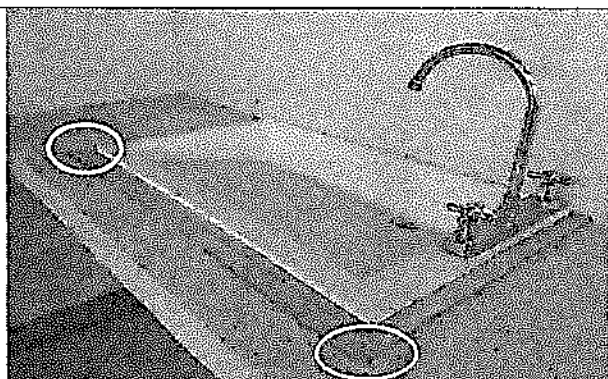


Se instaló silicona a las puntas de la base de aluminio para evitar accidentes.

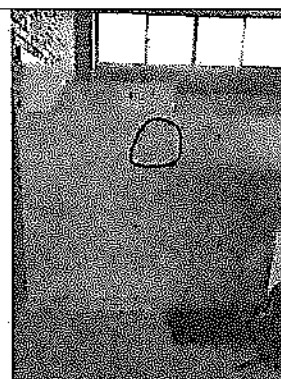


Toma corriente en baño de sala cuna que se le debe instalar tapa. Por estar a 1,2 m. de altura.




Cumple con norma Retie, buena iluminación natural y ventilación

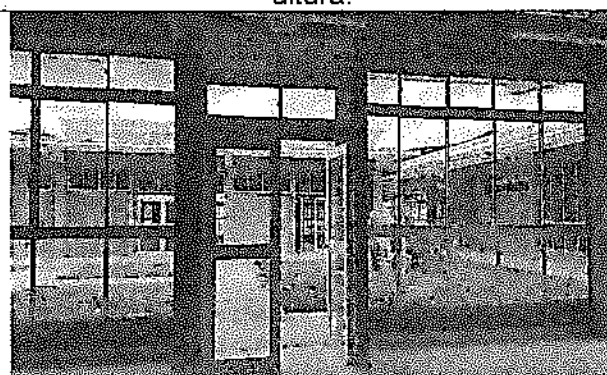

Puertas en salones con abra hacia el exterior, en aluminio con vidrio tiene chapa y se entregan 3 juegos de llaves por cada puerta

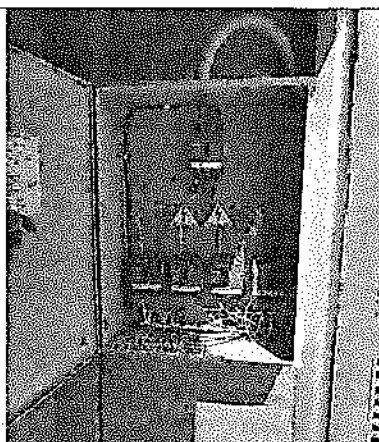

Tablero distribuidor de corriente que se encuentra de acuerdo a la norma.

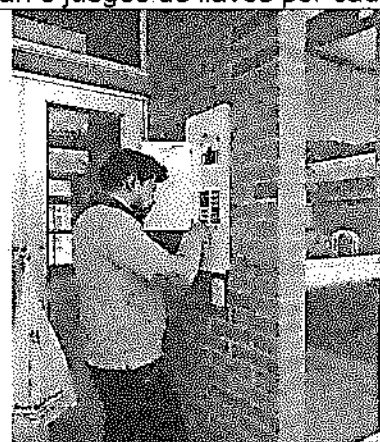

Caja de distribución de corriente en el bloque 2, que están un poco averiada porque los ladrones trataron de llevársela.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012



Caja de apantallamiento se observa que fue retirada la tubería de cobre que salía hacia los pararrayos.




Se observa la tubería de cobre que fue trozada antes del pararrayo.




Se observa como quedaron las abrazaderas al arrancar la tubería de cobre.



Los ladrones dejaron la escalera que utilizaron para montarse al techo. También dejaron los tubos EMT de 1/2" que pretendían llevarse.

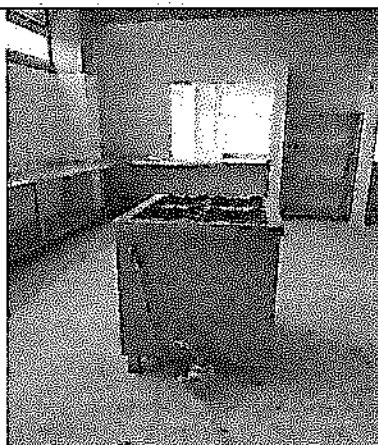

Se instaló la estufa a gas

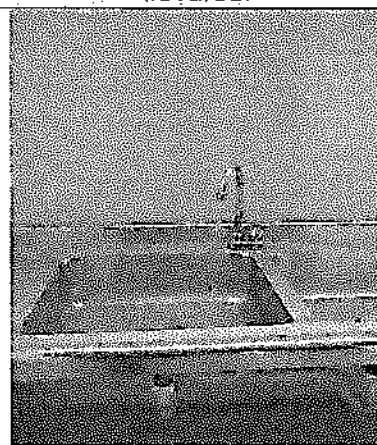


Si hay servicio de agua potable.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.


LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

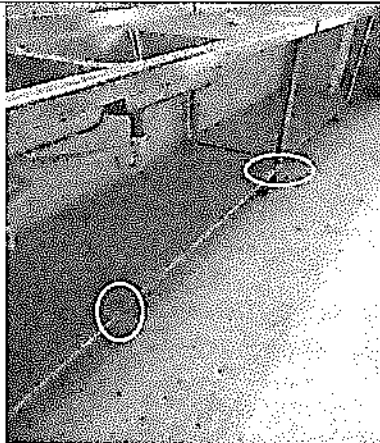


Se lijó y limo el mobiliario de cocina que presentaba rebaba



El piso de la cocina no se pudo observar si fue desmanchado por presentar mucha tierra y polvo.



Interruptor de contra incendios que fue manipulado por los ladrones y que se arreglar.

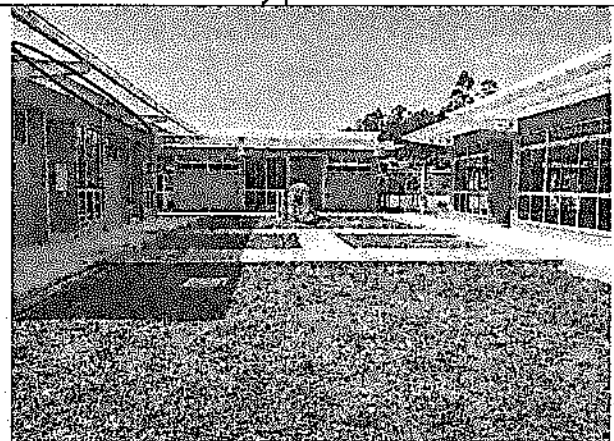

Patio central que ya se le realizó limpieza.


2. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE TOTA

OBJETIVO:

"Realizar visita a las Instalaciones de los CDI'S de los Municipios de Tota y Belén, que han terminado su construcción para verificar que se hayan subsanado las observaciones dadas en la visita de junio del año pasado, para que sean recibidos por Primera Infancia, visita que se realiza a solicitud de la Sede Nacional."

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INFORME DE COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO	F12.P5.GTH	06/02/2018
		Versión 3	Página 8 de 12

PARTICIPANTES:

Dr. Edgar Antonio Moreno Chaparro alcalde del Municipio de Tota
Sr. Johan S. Jaimes R – delegado del C.Z. Sogamoso.
Ing. Sonia Rincón Apoyo - Infraestructura del ICBF Regional Boyacá

ACTIVIDADES REALIZADAS:


El 14 de febrero del presente año, se visita nuevamente las instalaciones del CDI de Tota, con el fin de verificar si el Contratista de FONADE cumplió con el arreglo de las observaciones dejadas en la visita del 22 de junio del año pasado.

Se realiza recorrido por a la infraestructura en compañía del Dr. Edgar Moreno, Alcalde Municipal de Tota, Ing. Carlos E. Naranjo, Secretario de Planeación; Johan Sebastián Jaimes, Delegado C.Z. Sogamoso, para verificar si las observaciones fueron subsanadas por el contratista, estas observaciones fueron:

- Las chapas de las puertas en los baños del comedor se deben retirar o echarle algún material que las inmovilice. Si se cumplió, se instaló silicona en los seguros parte interna de las puertas.
- Instalar tapas a tomas corrientes que se encuentran a una altura de 1.4 m. en baños de sala cuna y en aula múltiple. No se cumplió.
- Se debe definir el pago de celaduría y servicios para el CDI al momento de realizar contrato con operador. La Celaduría quedo bajo responsabilidad de la Administración Municipal, cuando FONADE hizo entrega de las llaves el día 22 de junio de 2018.
- El cuarto de hidroneumático no coincide en cuanto a las medidas con la norma GIPI 2016 del ICBF. Quedo de ese tamaño según diseño entregado por FONADE al Contratista.
- Instalar estufa a gas. Si se cumplió
- Se lijo y limo los mobiliarios en acero inoxidable que se encuentran en la cocina que presentaban rebaba que era un riesgo de accidente para los empleados. Si se cumplió.
- A los calentadores de agua en las baterías de baños se le debe colocar un tubo espiral que recubra los cables eléctricos, para evitar cualquier tipo de accidente. Si se cumplió.
- Cambio de ducha tipo ganso a ducha teléfono en espacio de cambia pañales de sala cuna. No se cumplió.


Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INFORME DE COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO	F12.P5.GTH	06/02/2018
		Versión 3	Página 9 de 12

Al realizar recorrido se observó que la chapa del aula múltiple se encuentra dañada, por lo que el Sr. Alcalde de Tota Edgar Moreno, manifiesta que él está dispuesto a corregir todos estos daños para que pueda entrar en operación el CDI, porque hasta ya cuenta con la dotación. También manifiesta que dispondrá de un bus para recoger a los N.N. que asisten a recibir atención en los 8 HCB familiares, de Modalidad Comunitaria los que transitarían para prestar el servicio ahora en la modalidad Institucional.

CONCLUSIONES:

- Se espera que el Dr. Edgar Moreno Alcalde del Municipio de Tota, realice los arreglos que el Contratista de obra no subsano, además que coloque el bus para el transporte de N.N y madres comunitarias para que asistan al CDI como lo manifestó en la visita.
- También se le solicita al Sr. Alcalde, que nos haga el favor de enviar vía correo electrónico los documentos entregados por FONADE, el 22 de junio del 2018 cuando le hizo entrega del CDI, estos documentos son: acta que FONADE realizó el día de la entrega de las llaves del CDI, el inventario que se realizó a la infraestructura de todos los mobiliarios, elementos y equipos instalados, certificado RETIE y certificaciones de servicios. 

Para constancia se firma en Tunja a los diez y ocho (18) días del mes de febrero de 2019.



Firma del Comisionado

Firma del Jefe Inmediato


Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012


REGISTRO FOTOGRAFICO VISITA AL CDI EN EL MUNICIPIO DE TOTA

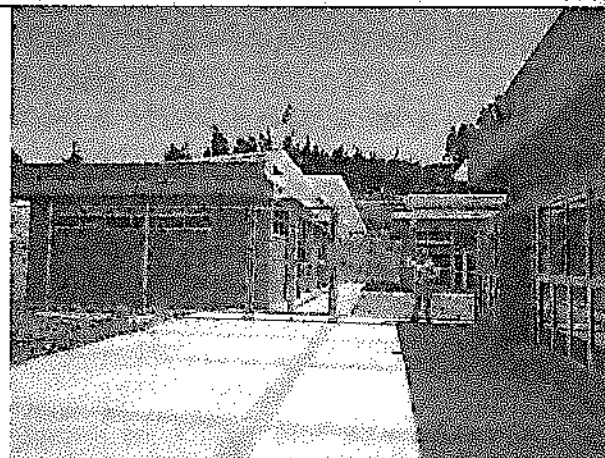

Fachada principal del CDI de Tota.

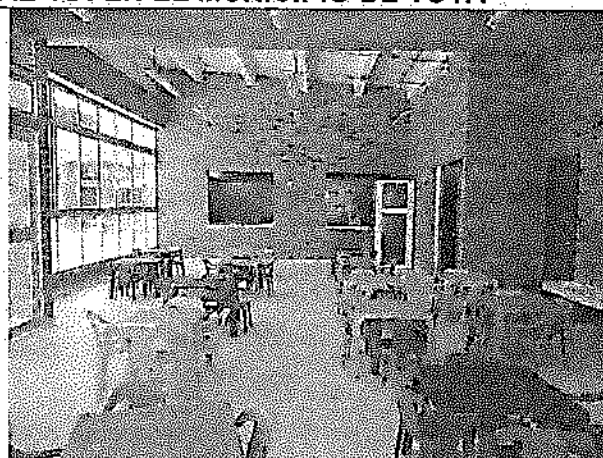

Salón comedor, se observa que ya tiene la dotación entregada por la Gobernación.

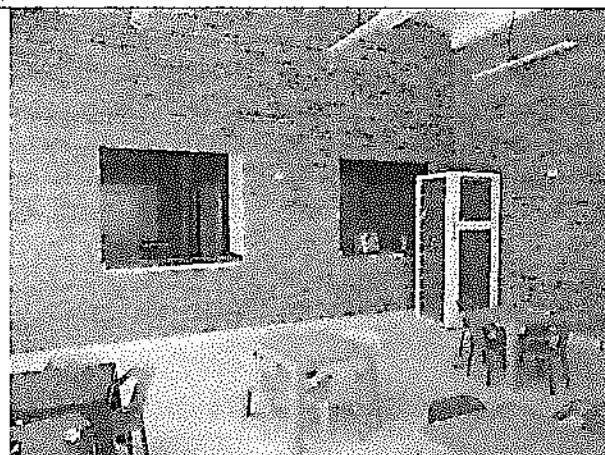


Se observa dotación (nevera) lista para ser utilizada por el operador.



Se instaló estufa a gas, se observa dotación de un fogón más para la cocina.



Se observa piso que al parecer fue desmanchado por el Contratista.

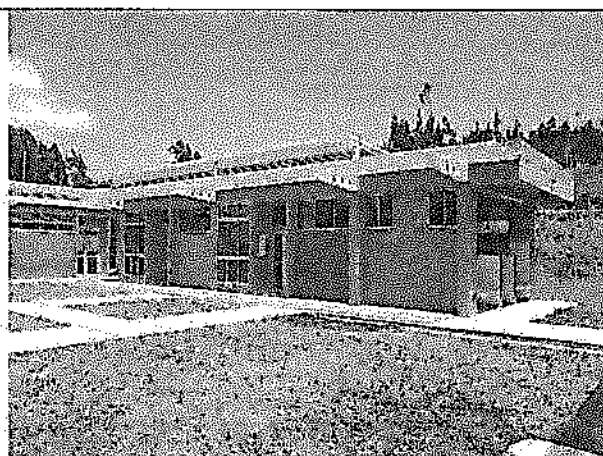


Patios o zonas verdes sin maleza.


Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.


LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1591 DE 2012

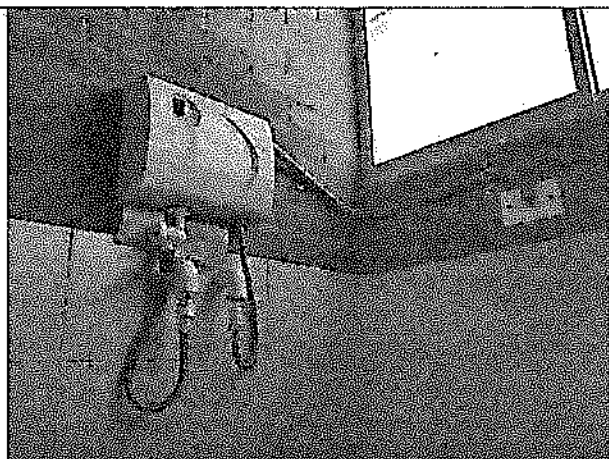


Se observó que los calentadores si se les instalado a los cables eléctricos el tubo espiral de recubrimiento para mayor protección.

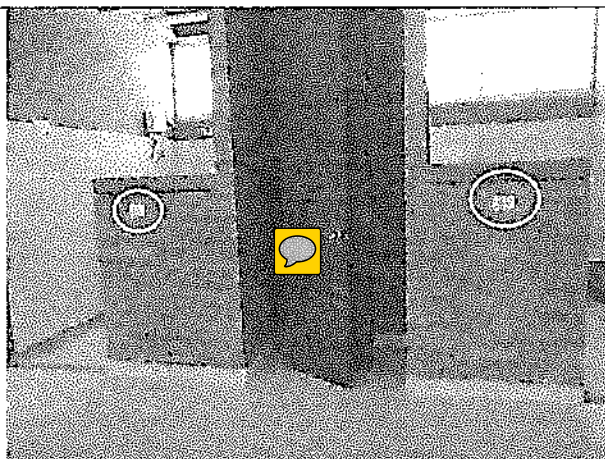

Aula múltiple en la entrada a baños existen dos tomas corrientes a una altura de 1,2 m. que no se les instaló la tapa lisa.

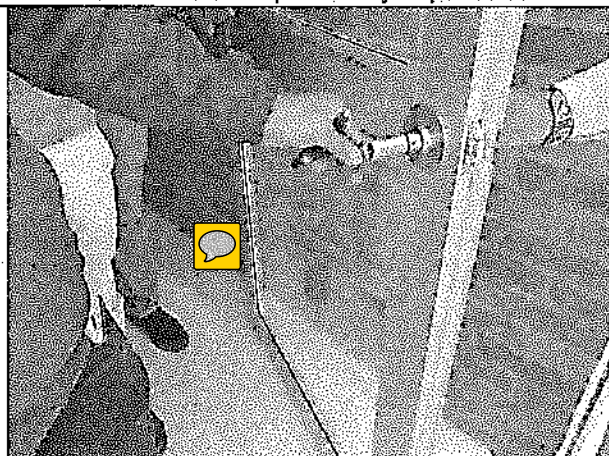


Chapa en Aula Múltiple, que se encuentra dañada.

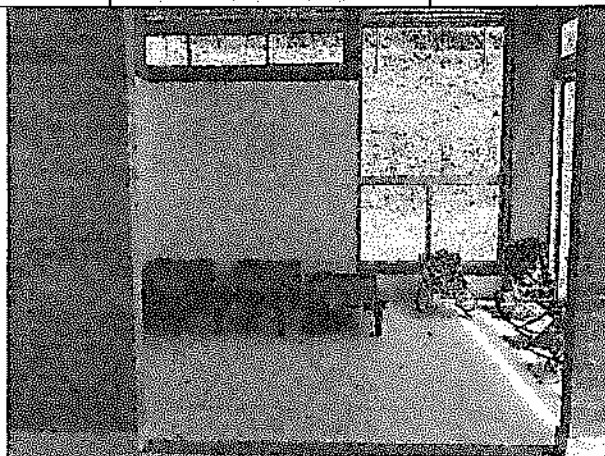

Sala Cuna con la dotación.




Cunas en madera dotación entrega por al Gobernación.





Duchas tipo gancho que no se cambian porque en el contrato no se especificó que era ducha

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1561 DE 2012

	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INFORME DE COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO	F12.P5.GTH	06/02/2018
		Versión 3	Página 12 de 12

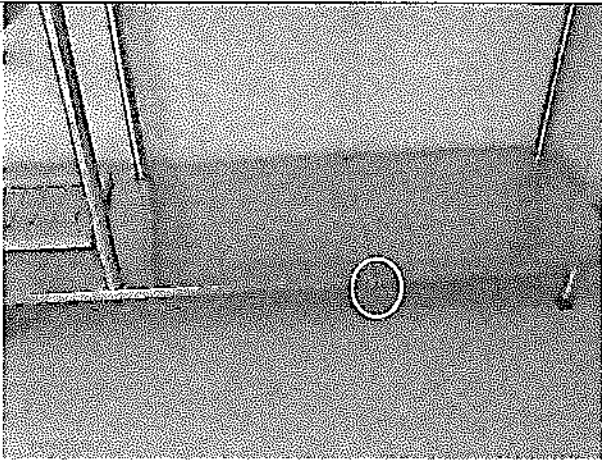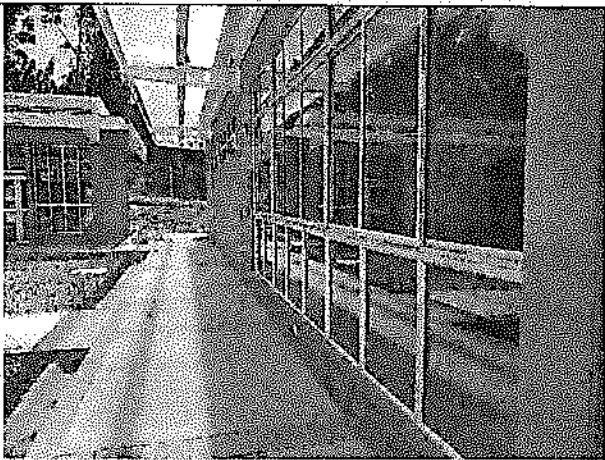teléfono.	
	
Se lijó y limo el mobiliario de cocina que presentaba rebaba.	Pasillos de circulación del bloque administrativo del CDI.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
